



Dirección General de Administración

Of. No. DGA/732/2020

Xalapa de Enríquez, Ver. 28 de octubre 2020.

A

DIPUTADO RUBÉN RÍOS URIBE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA
QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESENTE

Por instrucciones de la Magda. Isabel Inés Romero Cruz, Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, en su carácter de representante de este Poder Judicial y, en el marco de las autorizaciones contenidas en los Decretos números 346 y 624 publicados en las Gacetas Oficiales del Estado números extraordinarios 412 y 056 de fechas dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y siete de febrero de dos mil dieciocho, asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 19 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le envío el **Reporte del Avance que guardan los Proyectos de Asociación Público-Privada del primer semestre de 2020**, referente a la Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento de Ciudades Judiciales en distintos municipios del Estado.

Aprovecho la ocasión para saludarlo y manifestarle mi distinguida consideración y respeto.




ATENTAMENTE

L.E. JOANA MARLEN BAUTISTA FLORES
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



H. TRIBUNAL S. DE JUSTICIA
DE VERACRUZ LLAVE

Magda. ISABEL INÉS ROMERO CRUZ. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. PRESENTE Para su superior conocimiento.



Av. Lázaro Cárdenas 373, El Mirador, Xalapa, Ver. C.P. 91170




PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

**PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES
 REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE
 A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES
 EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	39,927,477.83
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

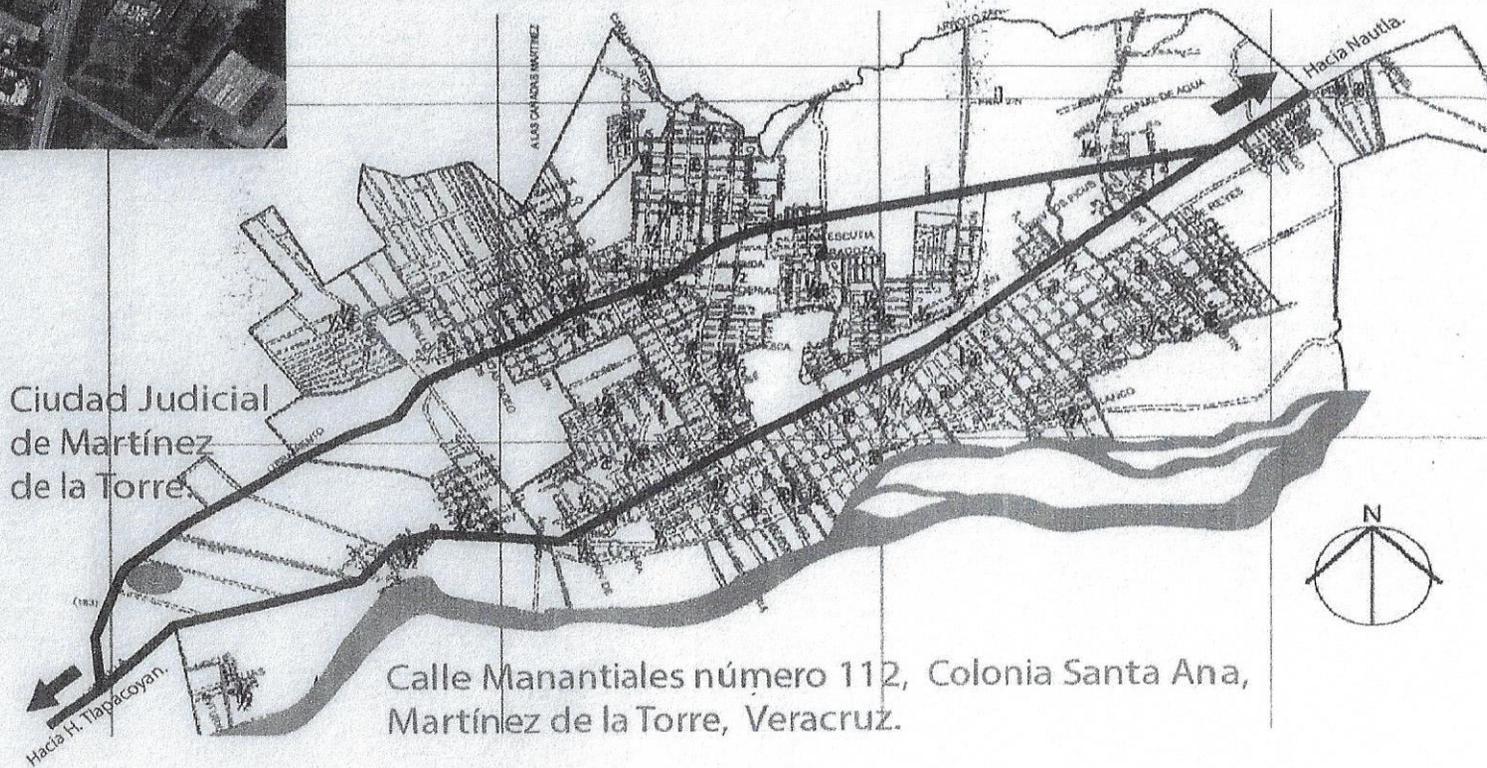

Calle Manantiales número 112, Colonia Santa Ana, Martínez de la Torre, Veracruz.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	39,927,477.83
NÚMERO DE MES	MES	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
			%		%
1	ENERO 2020		25.51%		3.83%
2	FEBRERO 2020		3.68%		8.41%
3	MARZO 2020		8.41%		6.27%
4	ABRIL 2020		6.27%		7.43%
5	MAYO 2020		7.43%		3.55%
6	JUNIO 2020		3.55%		5.52%
TOTAL			54.85%		35.01%




PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES

REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

INFORME:	SEGUNDO SEMESTRE 2020		PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020		MONTO CONTRATADO	\$ 39,927,477.83	CAPITULO:	AVANCE FISICO Y FINANCIERO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
AVANCE FÍSICO	29.06%	32.74%	41.15%	47.42%	54.85%	58.40%			
AVANCE FINANCIERO	3.83%	12.24%	18.51%	25.94%	29.49%	35.01%			

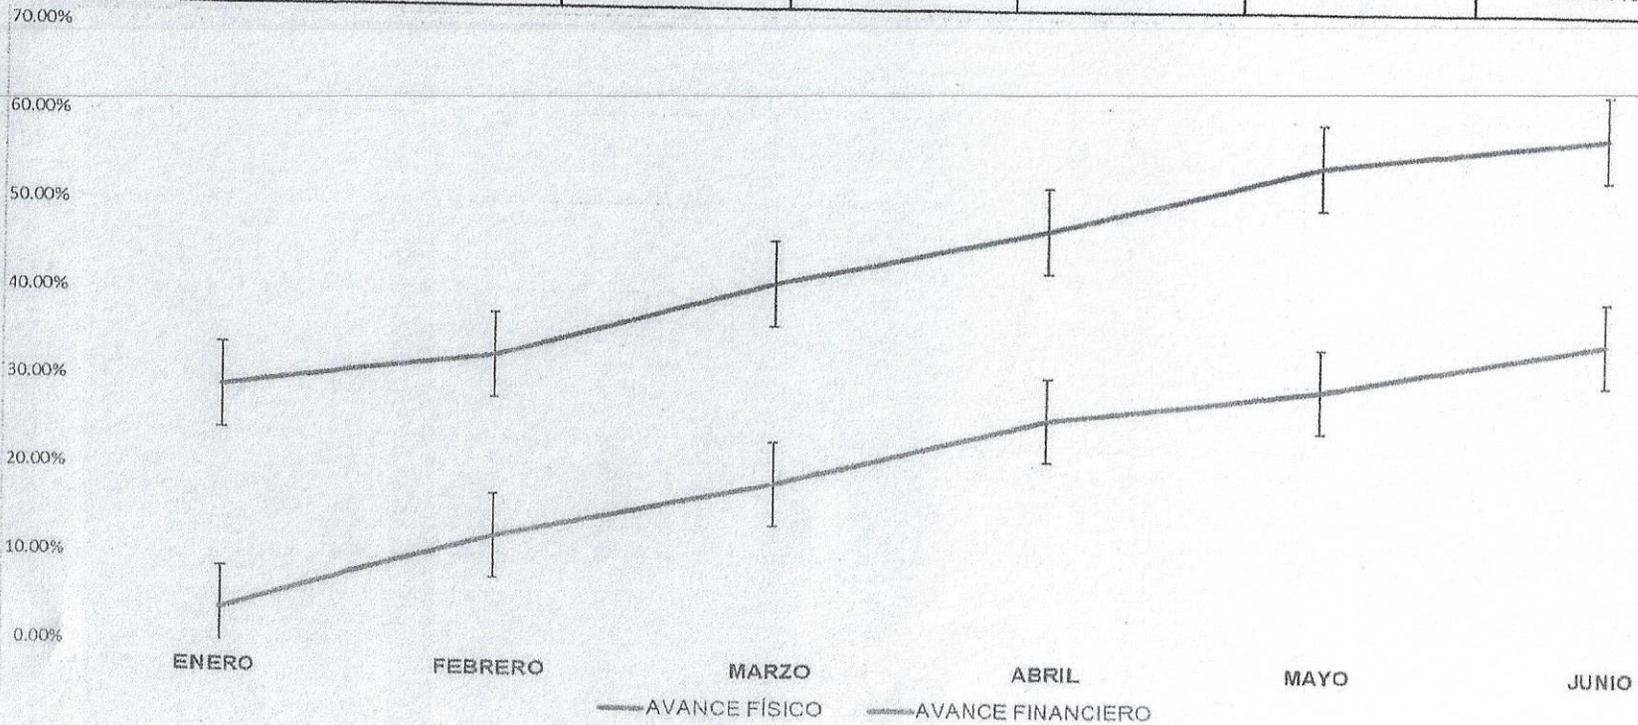



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES

REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	39,927,477.83
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

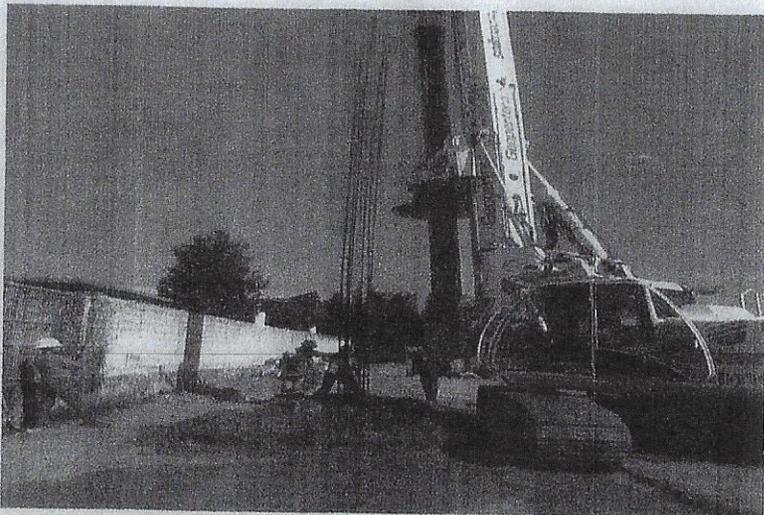

TERRAPLEN PARA ÁREA DE ESTACIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE ARMADO PARA CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO.





SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA EL EDIFICIO.



**PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES
 REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE
 A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES
 EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO**

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	39,927,477.83
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

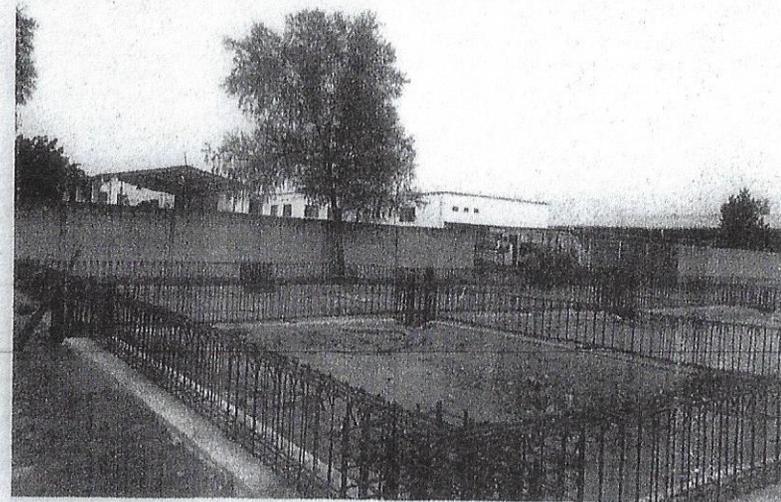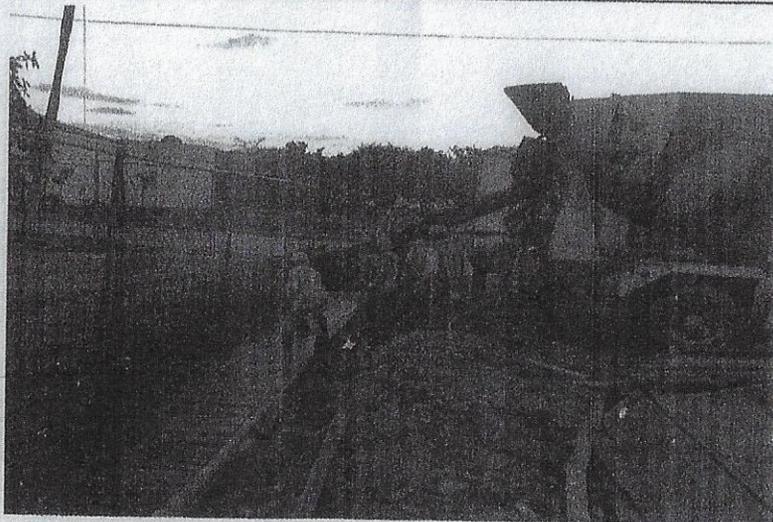

COLOCACIÓN DE ZAPATA EN CIMENTACIÓN PARA MURO DE COLINDANCIA, VISTA DE ACERO EN CIMENTACIÓN EN CONTRATRABES Y DADOS PARA EL EDIFICIO.

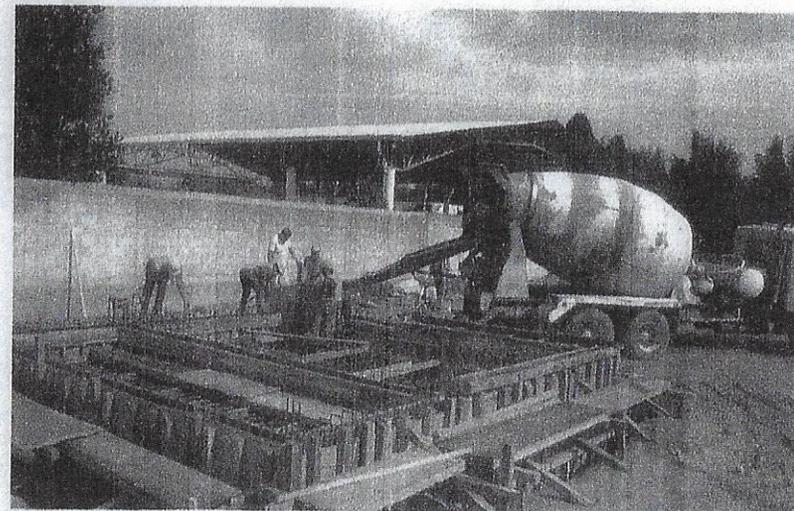
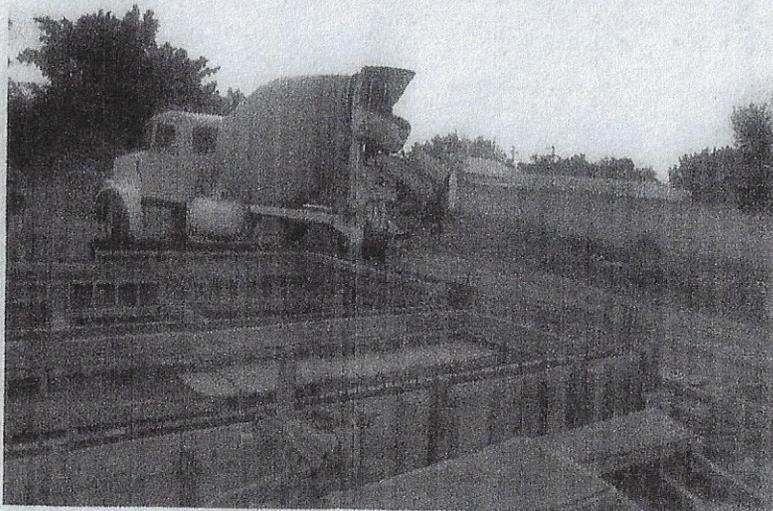


CIMBRADO PARA DADOS Y CONTRATRABES EN EL EDIFICIO, Y VISTA DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA CIMENTACIÓN EN CUARTO DE MÁQUINAS.


PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES
 REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE
 A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES
 EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	39,927,477.83
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

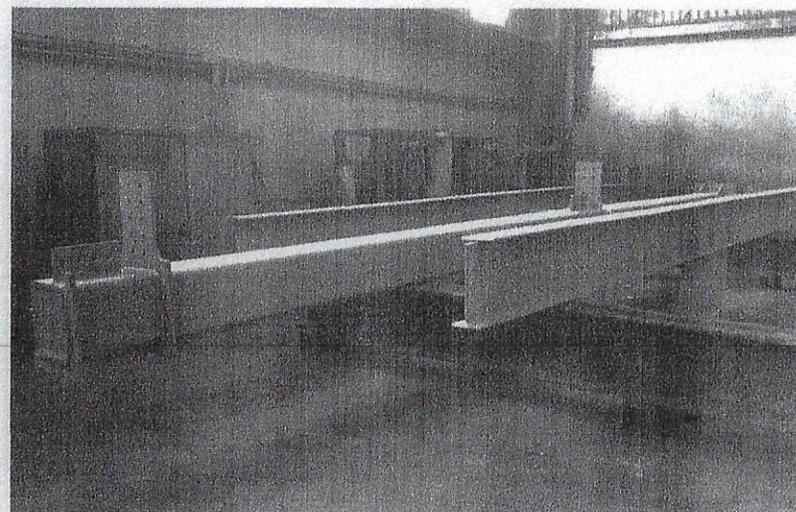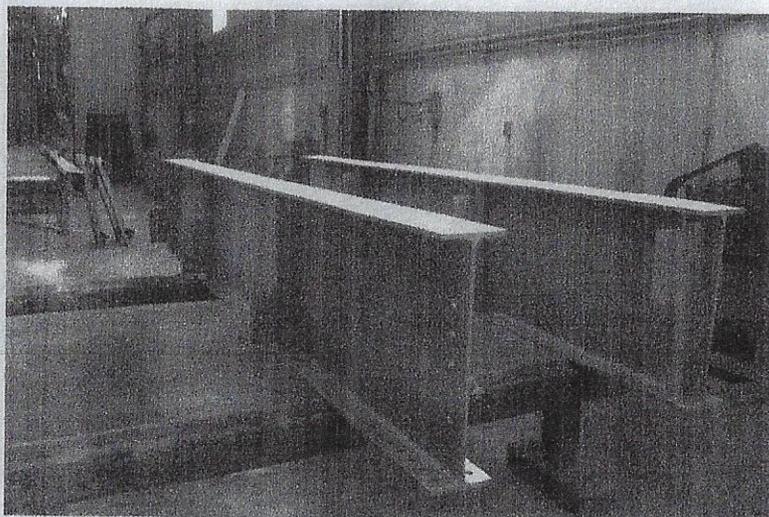

VERIFICACIÓN DE ESTRUCTURA EN PLANTA.

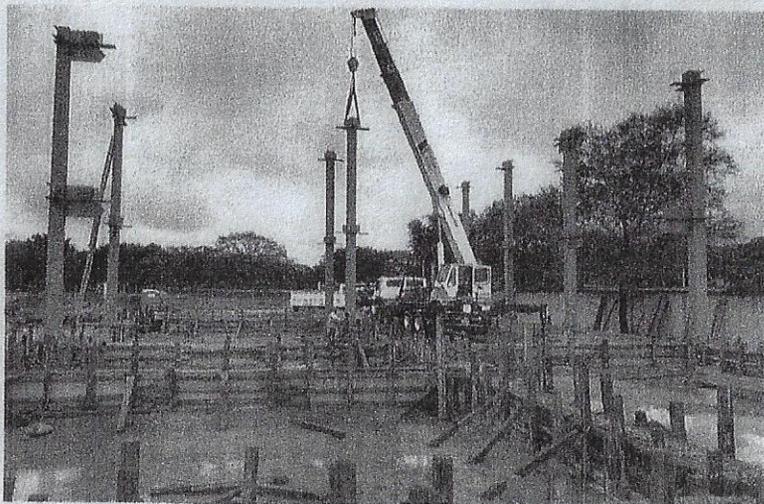

CIMENTACIÓN EN EL ÁREA DEL EDIFICIO, SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNAS Y VIGAS EN ESTRUCTURA.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES




REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	39,927,477.83
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

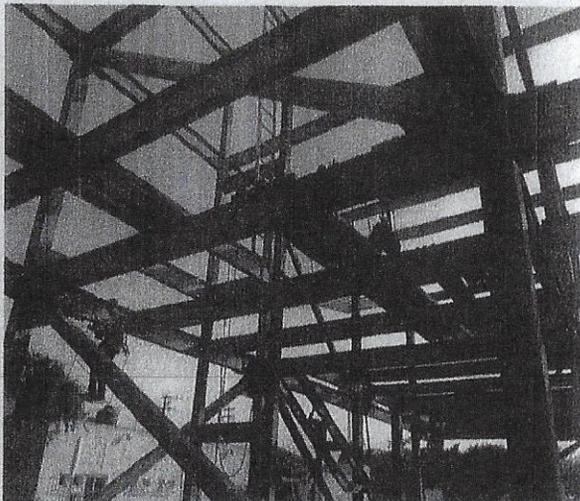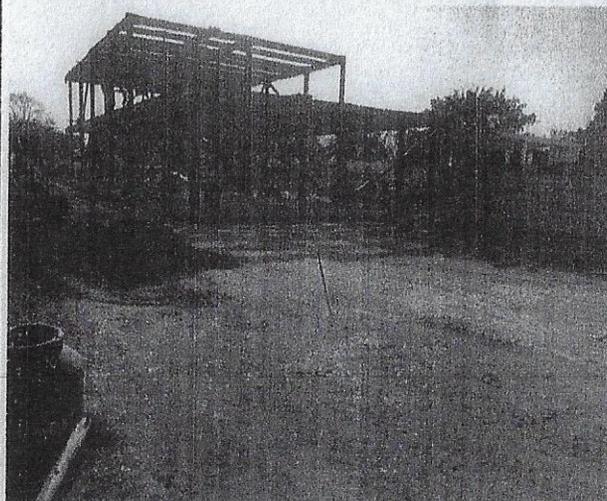

MONTAJE DE VIGAS Y SUMINISTRO DE LAMINA DE LOSA CERO EN EL EDIFICIO.

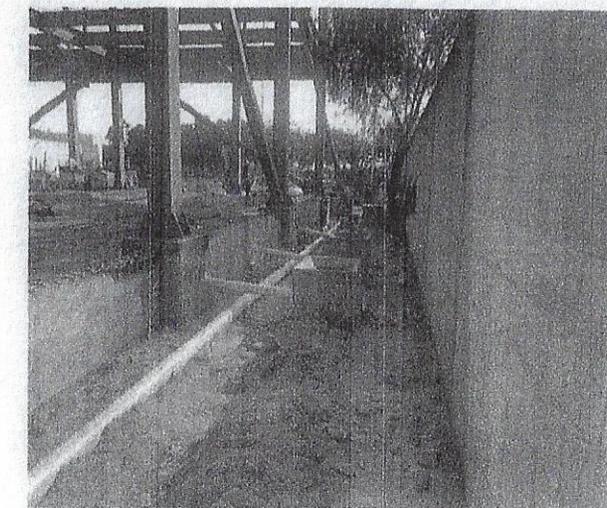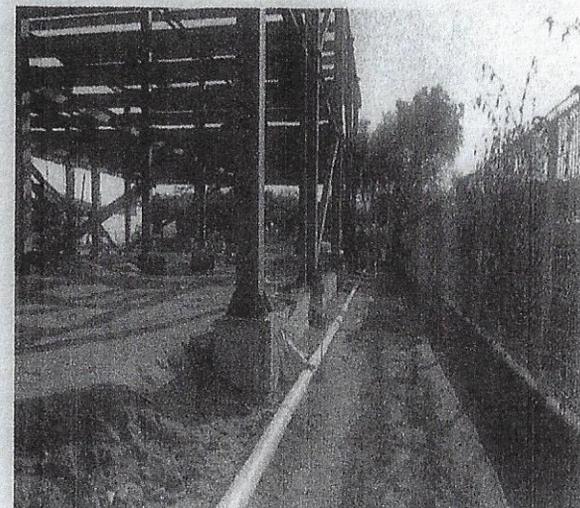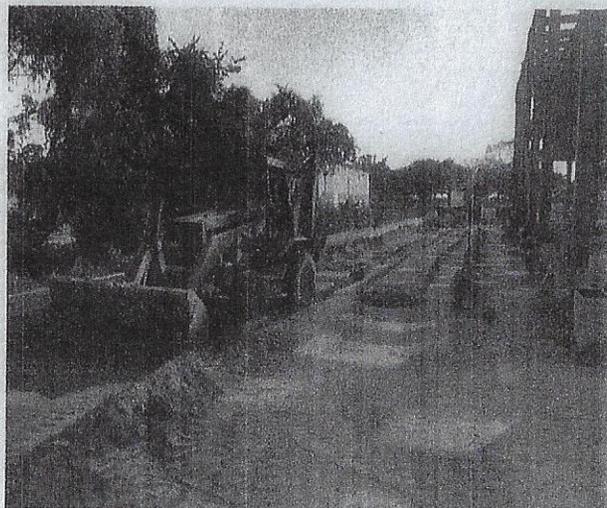

SUBRASANTE EN ÁREA DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO E INSTALACIONES SANITARIAS.



TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CUARTO DE MÁQUINAS Y REGISTROS PLUVIALES EN EL EDIFICIO.

PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES


REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE
A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES
EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	39,927,477.83
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

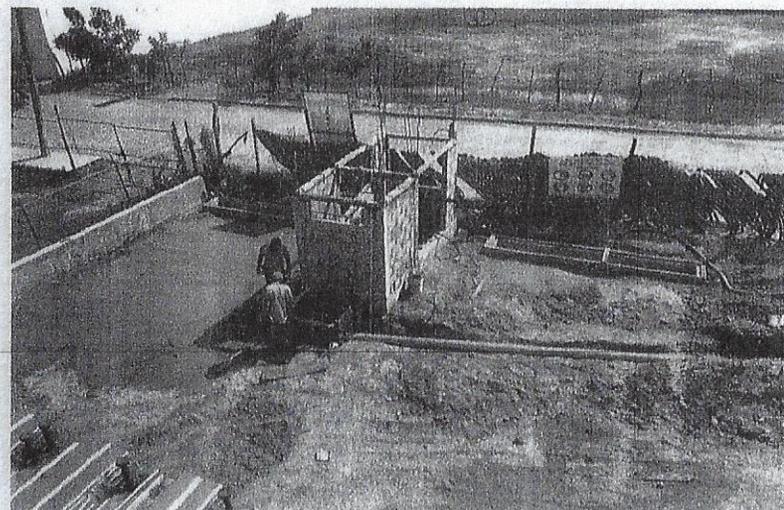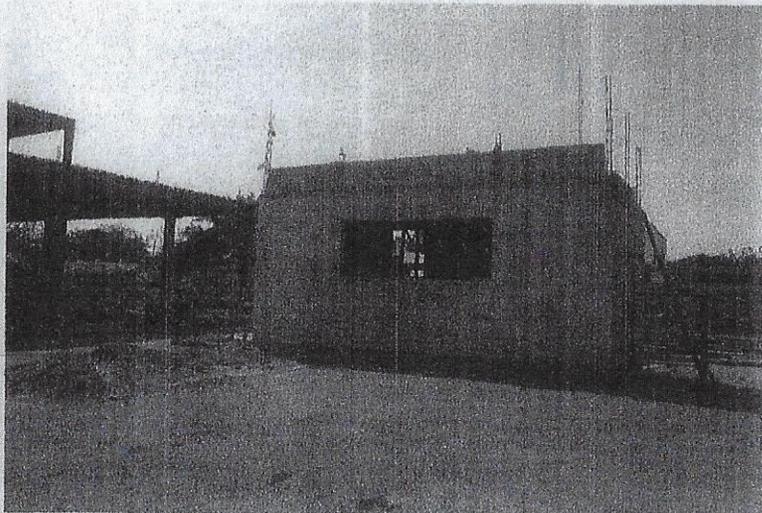

VISTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CUARTO DE MÁQUINAS Y CASETA DE ACCESO.

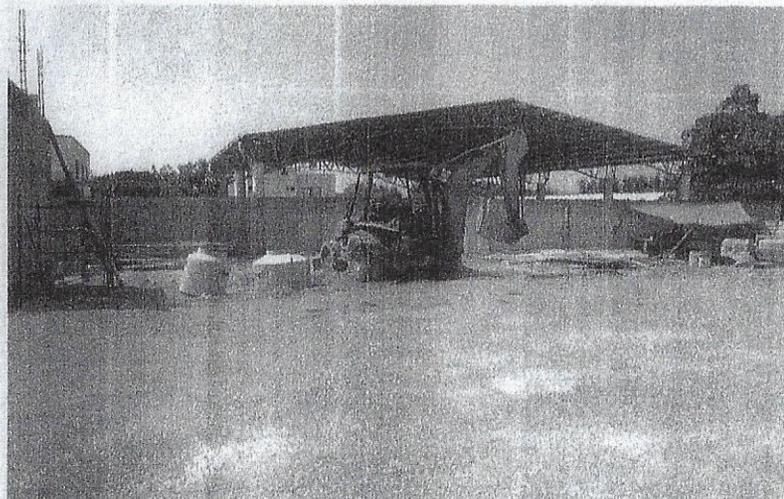

VISTA DEL EQUIPO EN LA OBRA.




PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES


REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA


INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	39,927,477.83
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

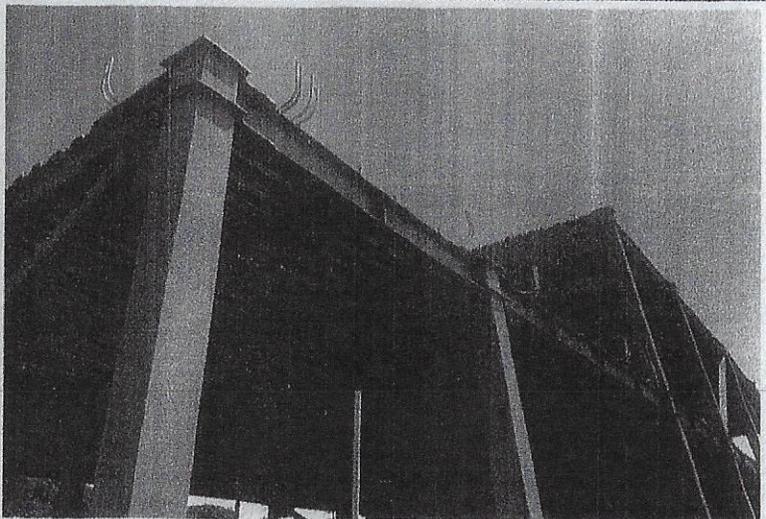


TRABAJOS DE LOSA CERO

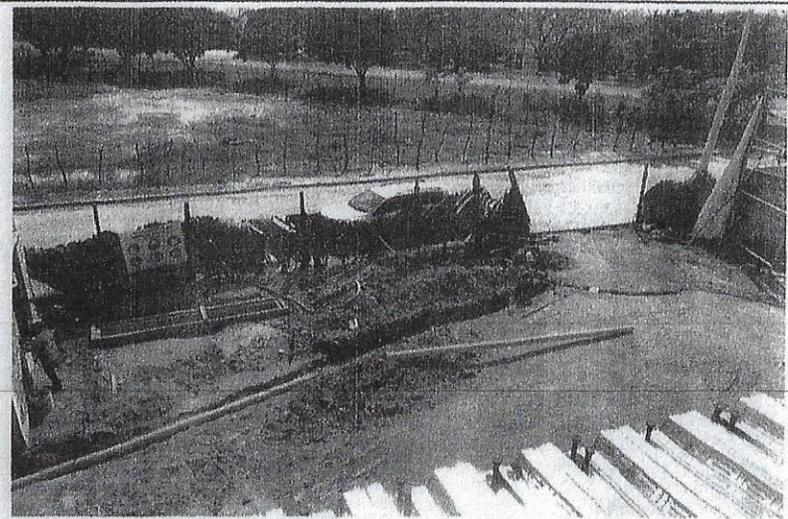

TRABAJOS EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESO PRINCIPAL.

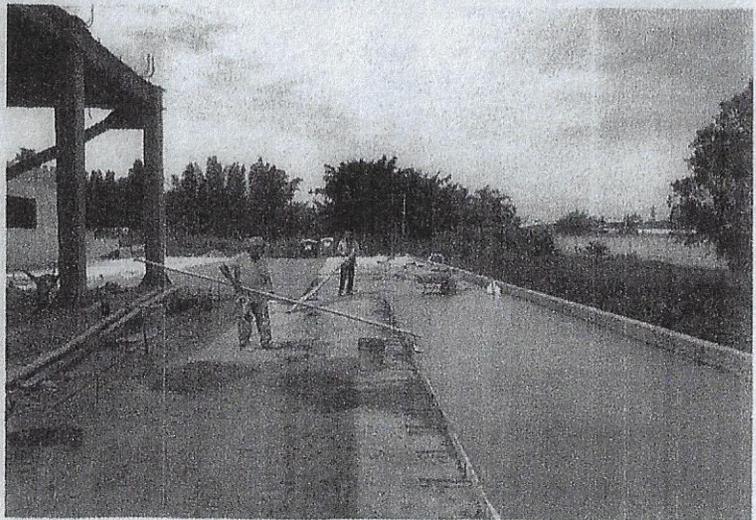

BASE HIDRAULICA Y PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN ESTACIONAMIENTO

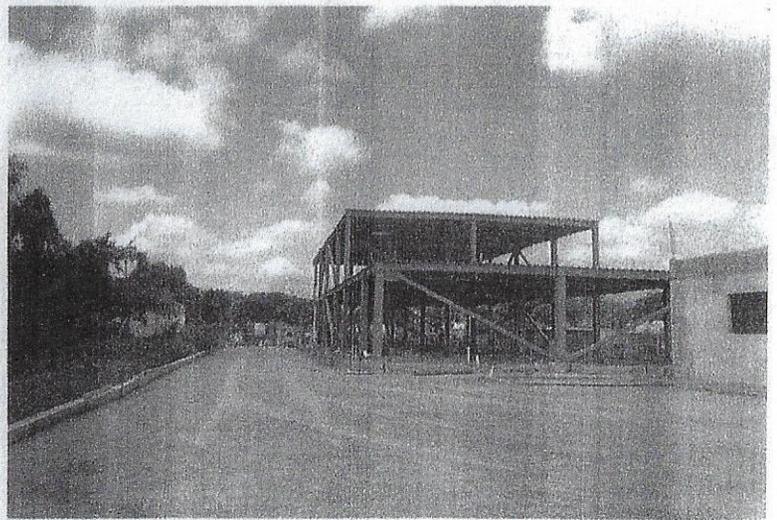




PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	73,478,840.77
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

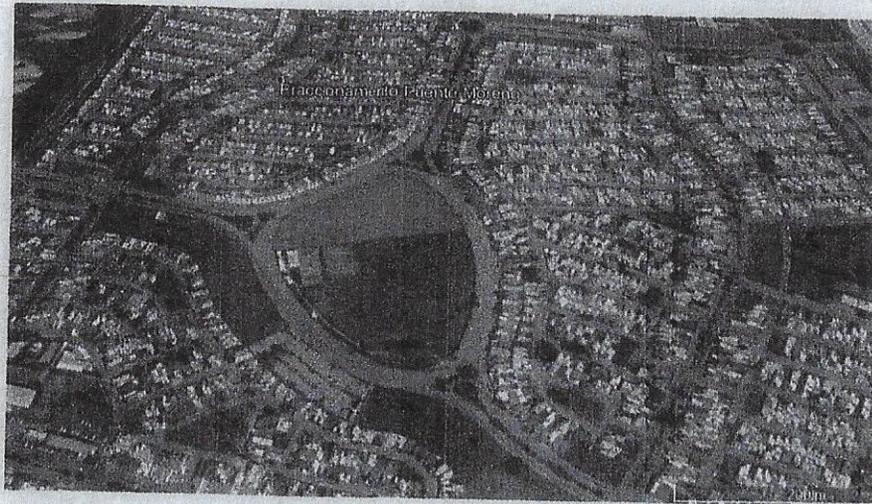

Ciudad Judicial
de Medellín de
Bravo.

Avenida Circuito
Puente de Moreno, lote 2,
Fraccionamiento Puente Moreno,
Medellín de Bravo, Veracruz.

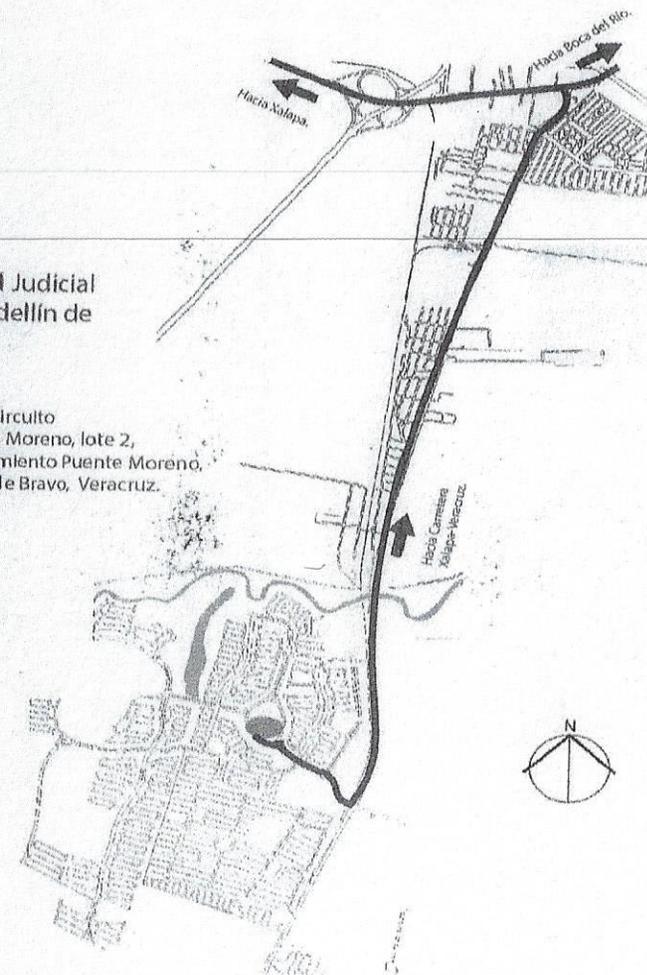



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES

REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	73,478,840.77
NÚMERO DE MES	MES	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
		%		%	
1	ENERO 2020	30.88%		2.69%	
2	FEBRERO 2020	11.84%		11.84%	
3	MARZO 2020	3.47%		3.47%	
4	ABRIL 2020	3.52%		3.52%	
5	MAYO 2020	3.56%		3.56%	
6	JUNIO 2020	8.71%		8.71%	
TOTAL		61.98%		33.79%	




PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.
PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES

**REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE
 A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES
 EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO**

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020		PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020			MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	73,478,840.77
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
AVANCE FÍSICO	30.88%	42.72%	46.19%	49.71%	53.27%	61.98%		
AVANCE FINANCIERO	2.69%	14.53%	18.00%	21.52%	25.08%	33.79%		

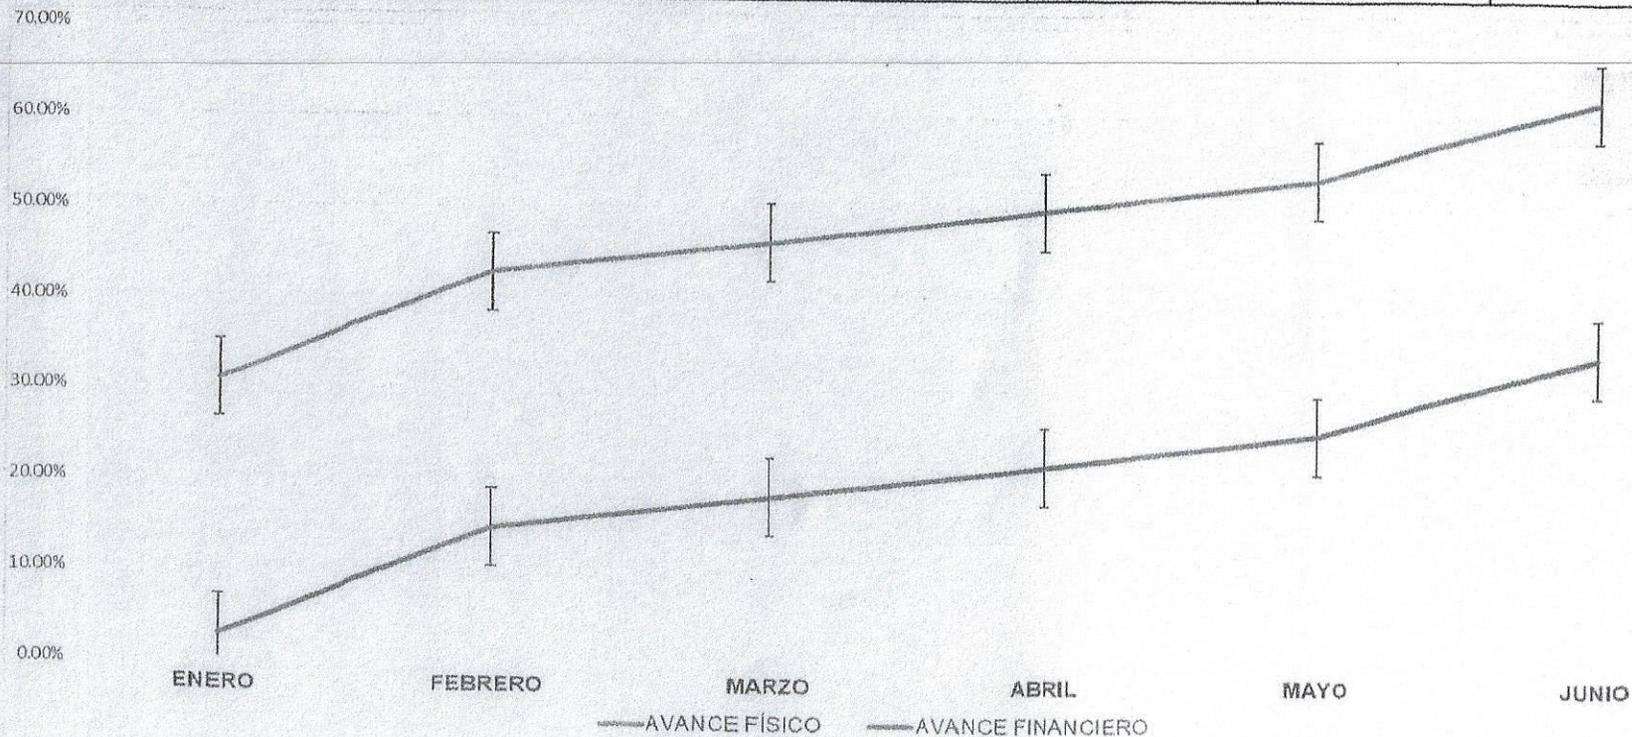





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.



**PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES
 REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE
 A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES
 EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO**

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	73,478,840.77
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

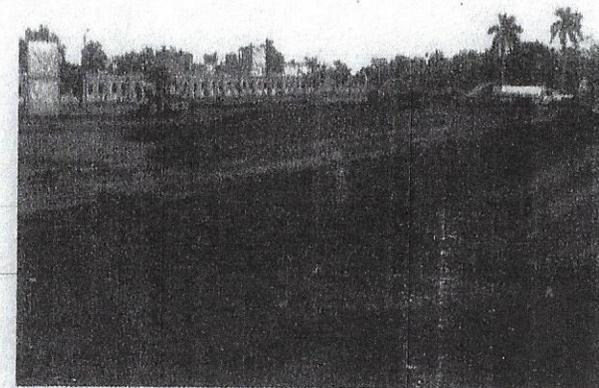

TRABAJOS PRELIMINARES Y TERRAPLEN PARA DESPLANTE DEL EDIFICIO Y ESTACIONAMIENTO.


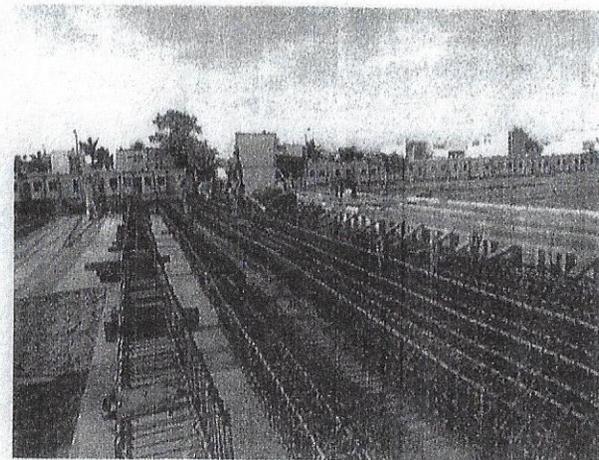
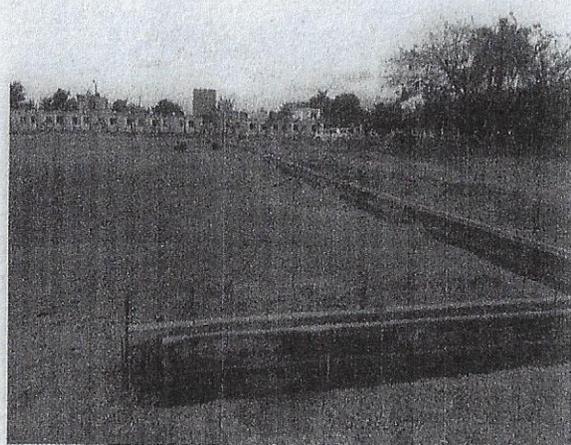


SUMINISTRO HABILITADO Y COLADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN PARA EL EDIFICIO..



PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES
REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE
A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES
EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

INFORME	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	73,478,840.77
---------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

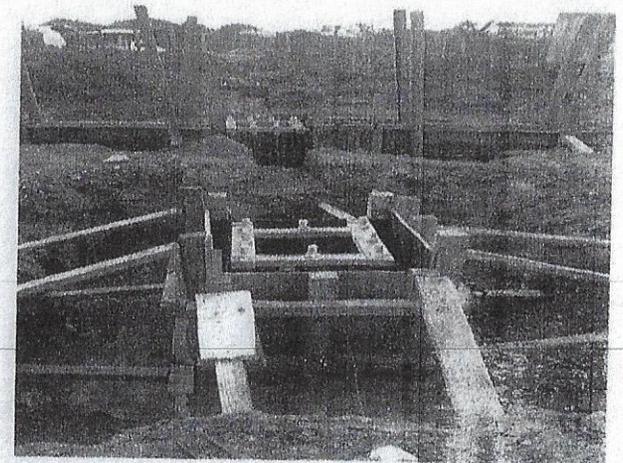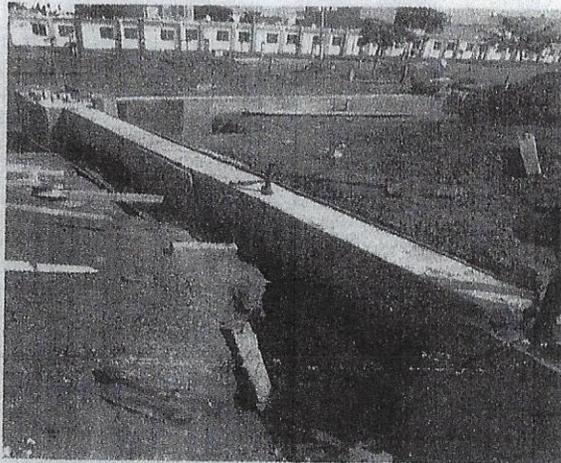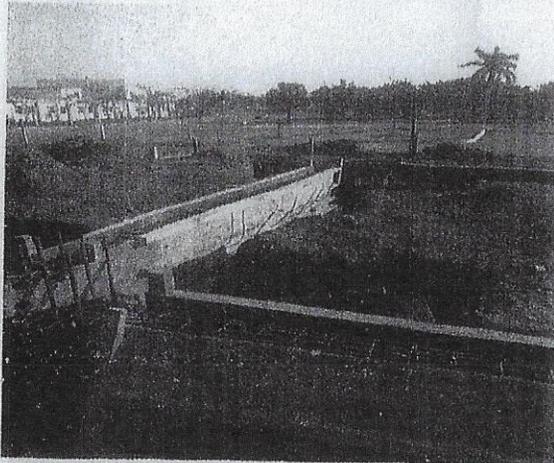

CIMBRADO DE CONTRATRABES Y DADOS PARA LA CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL.

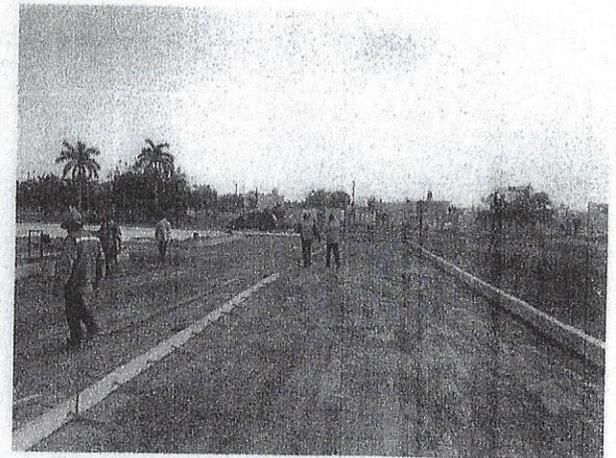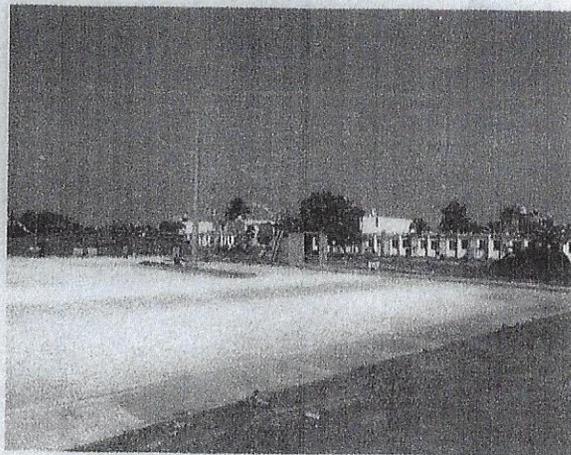



TRABAJOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.


PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	73,478,840.77
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

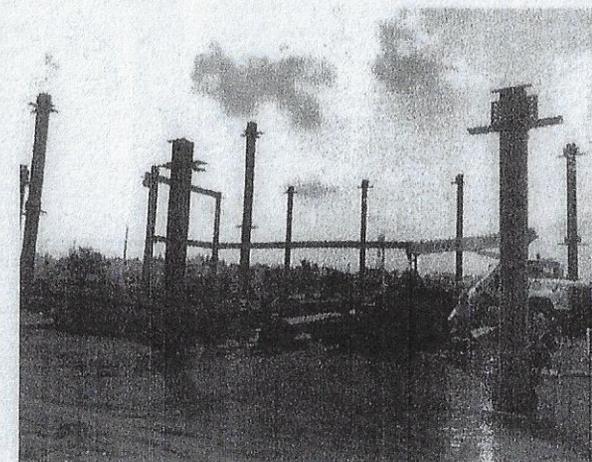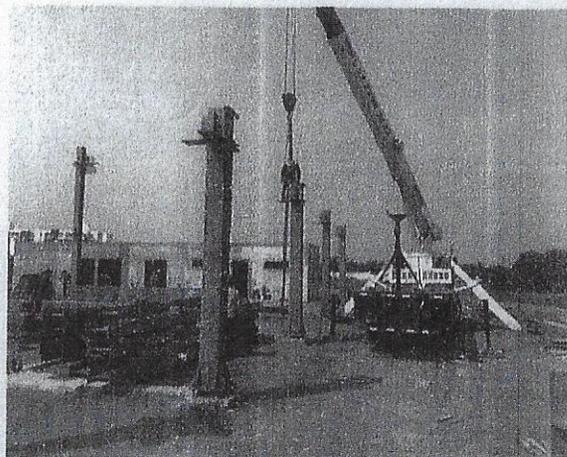

TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.



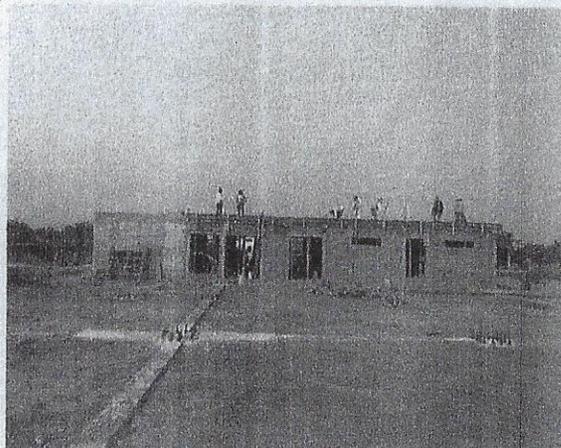


TRABAJOS DE ALBAÑILERÍAS EN CUARTO DE MÁQUINAS, VIDEOVIGILANCIA Y CASETA DE VIGILANCIA.



PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES
REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE
A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES
EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	73,478,840.77
-----------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------

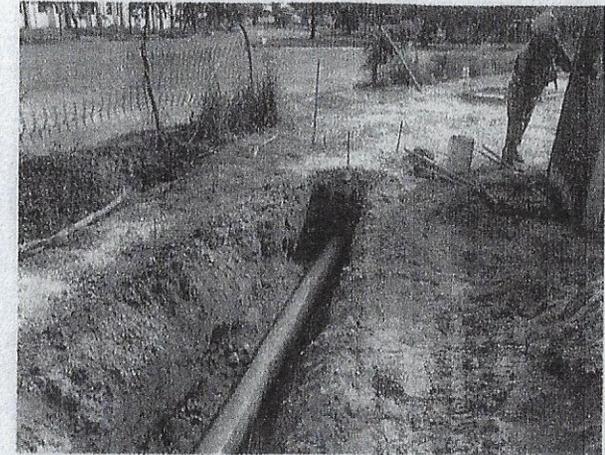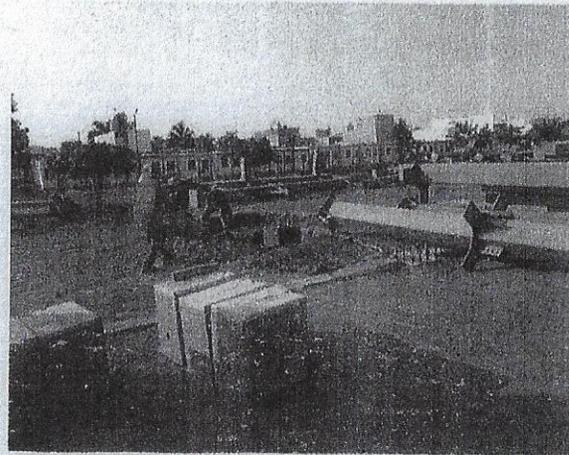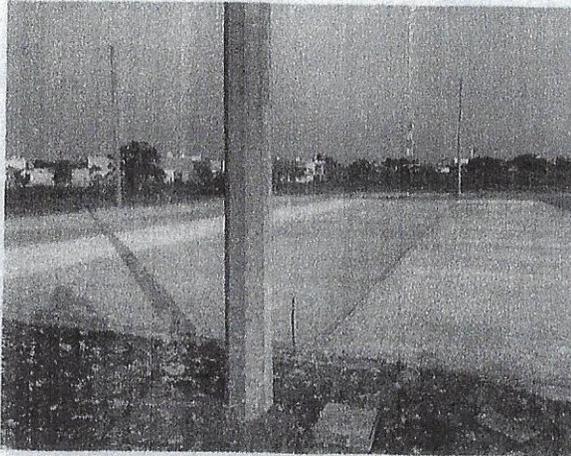

TRABAJOS DE INSTACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO DE REGISTROS E INTALACIÓN DE RED SANITARIA

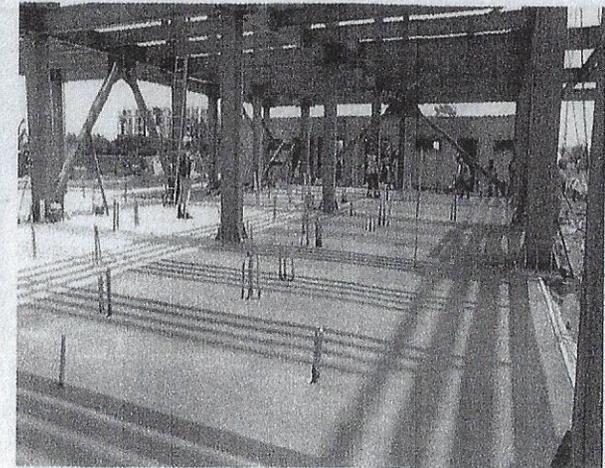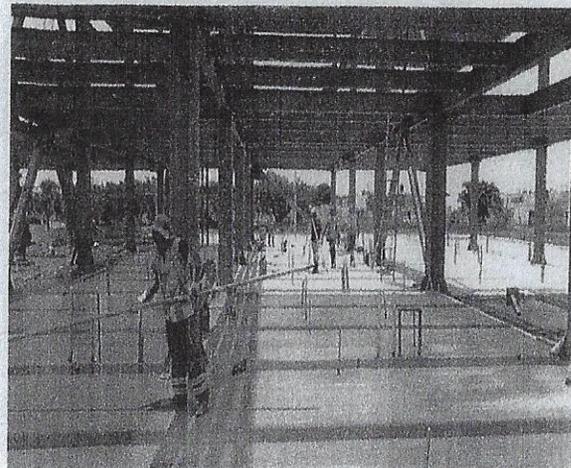

FIRME DE CONCRETO ARMADO EN PLANTA BAJA, SALIDAS DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS..



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ




PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Of. No. DGA/732/2019



PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	39,927,477.83
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

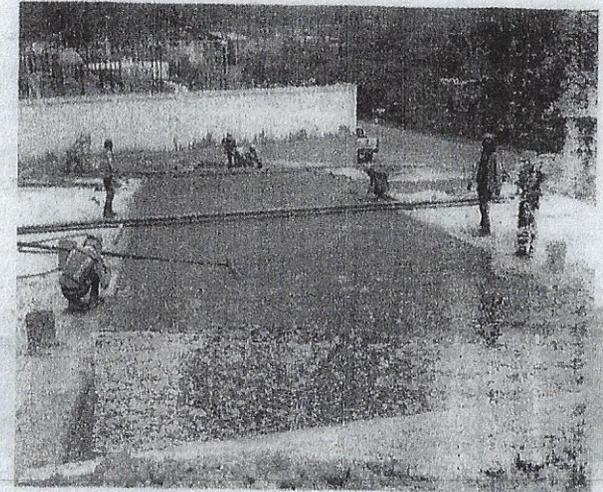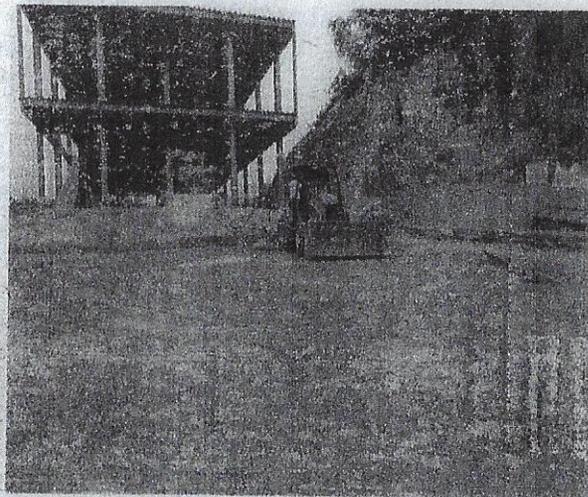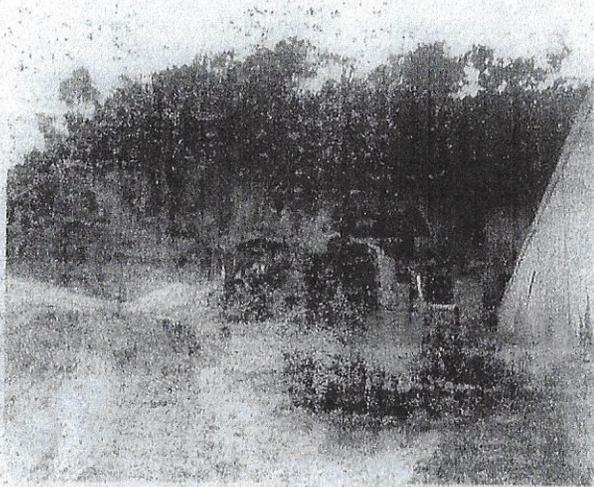

VISTA DE TRABAJOS DE BASE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO.

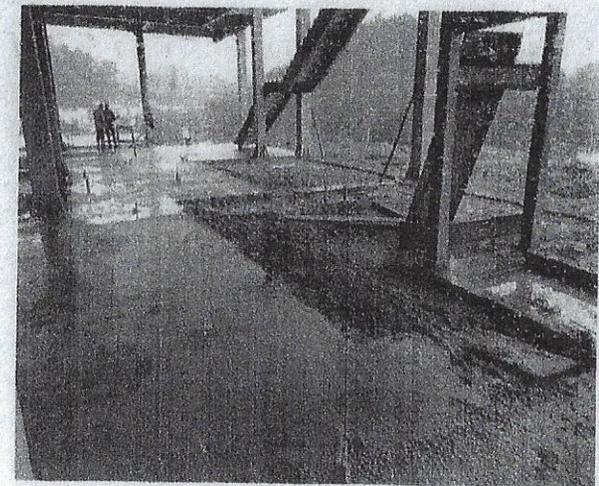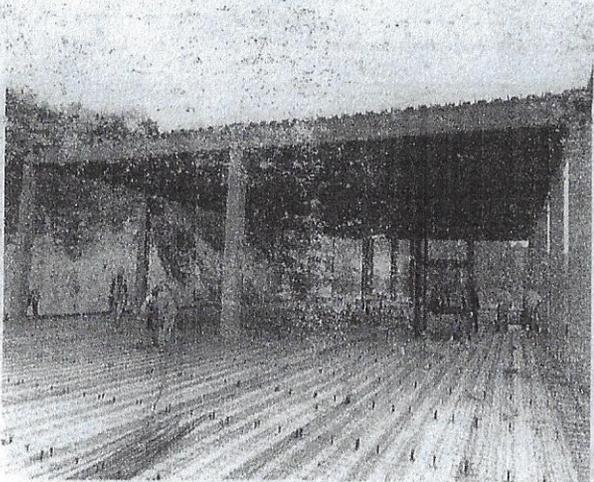


VISTA DE FIRME EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO.

VISTA DE LOSA DE ENTRE PISO DEL EDIFICIO.



PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES
REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE
A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES
EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	39,927,477.83
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

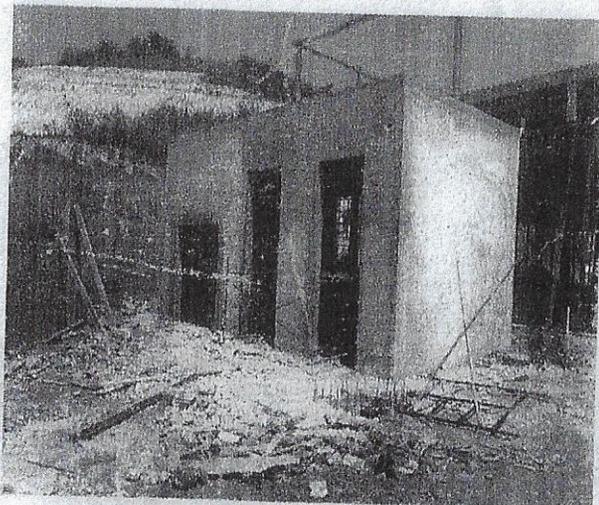

ALBAÑILERIAS EN CUARTO DE MÁQUINAS Y CIMENTACIÓN EN CASETA DE VIGILANCIA.

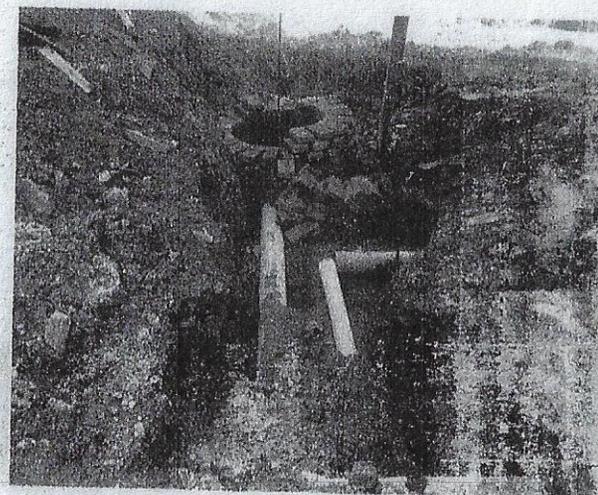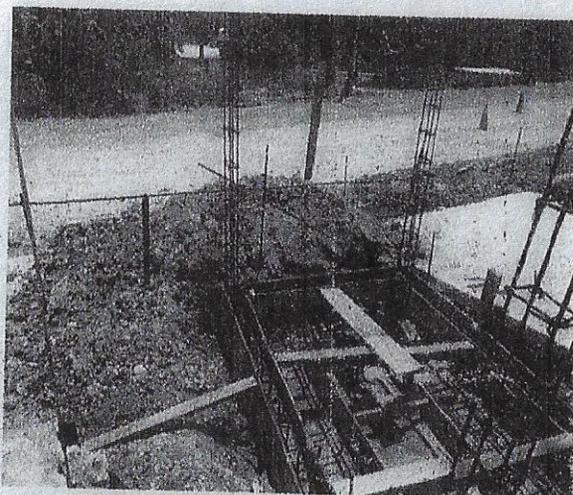

TRABAJOS DE INSTALACIONES SANITARIAS


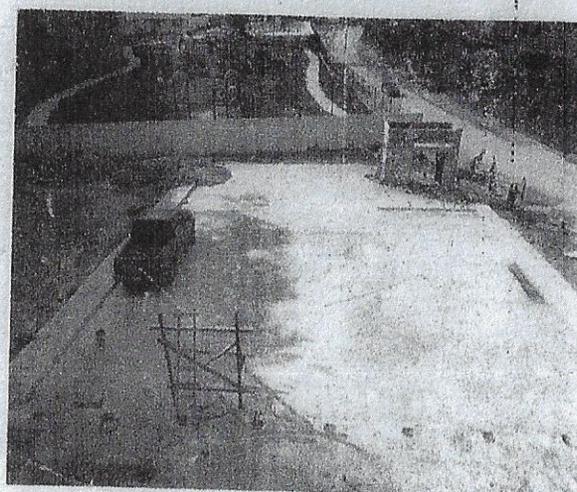
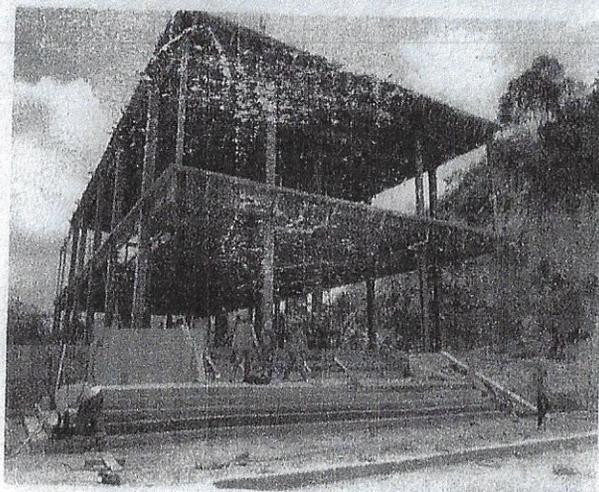


EDIFICIO PRINCIPAL, VISTA DEL ESTACIONAMIENTO, ESCALERAS DE ACCESO PEATONAL.






PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES
REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE
A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES
EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	73,478,840.77
----------	----------------------	----------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------

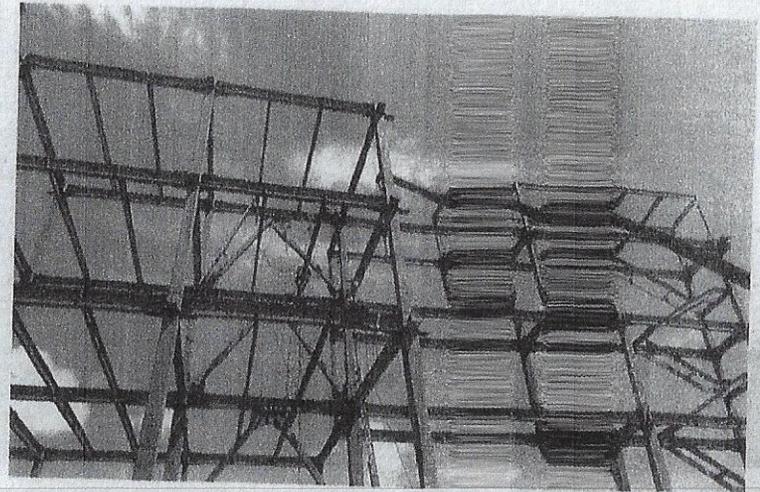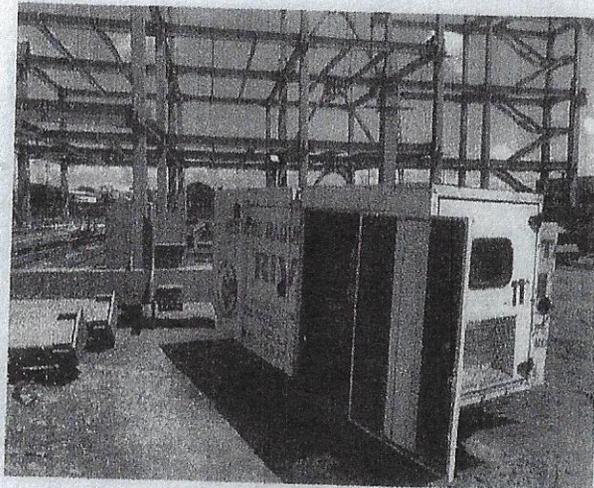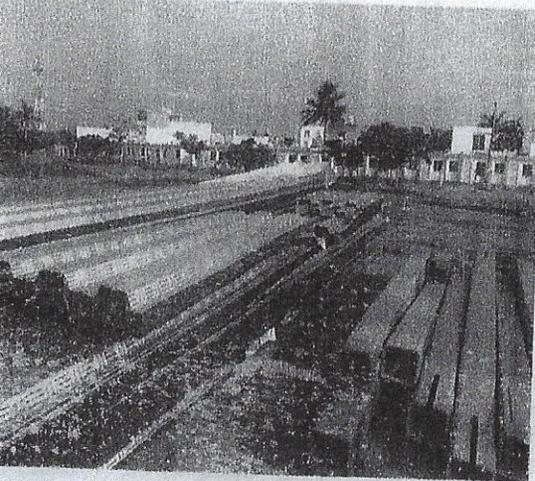

COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN EL EDIFICIO..

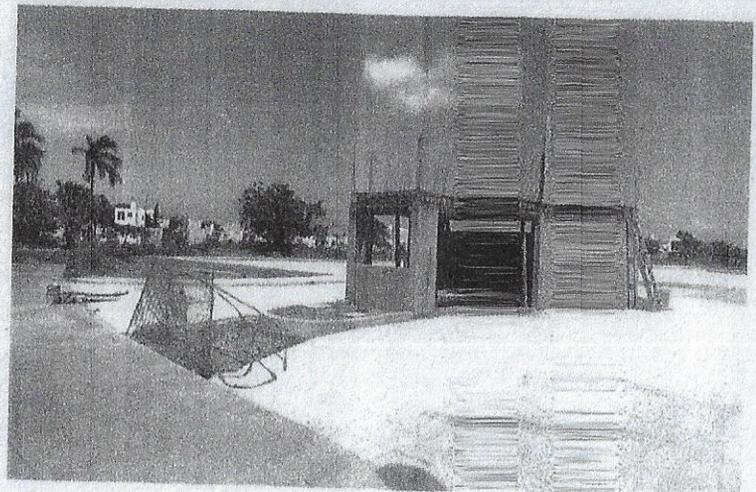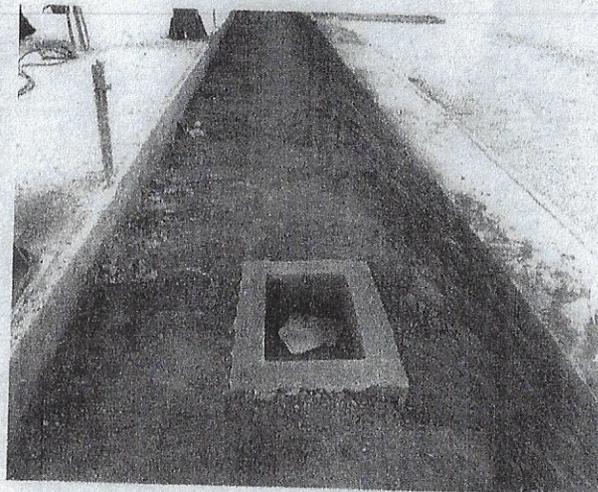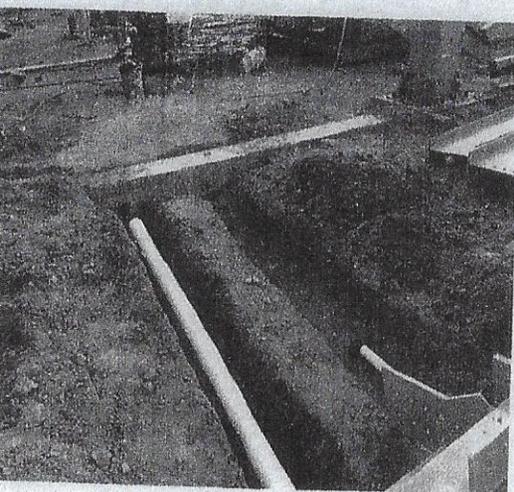

TRABAJOS DE RED SANITARIA PERIMETRAL AL EDIFICIO Y ALBAÑILERIA EN ACCESO DE CASETA




PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES

REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	73,478,840.77
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

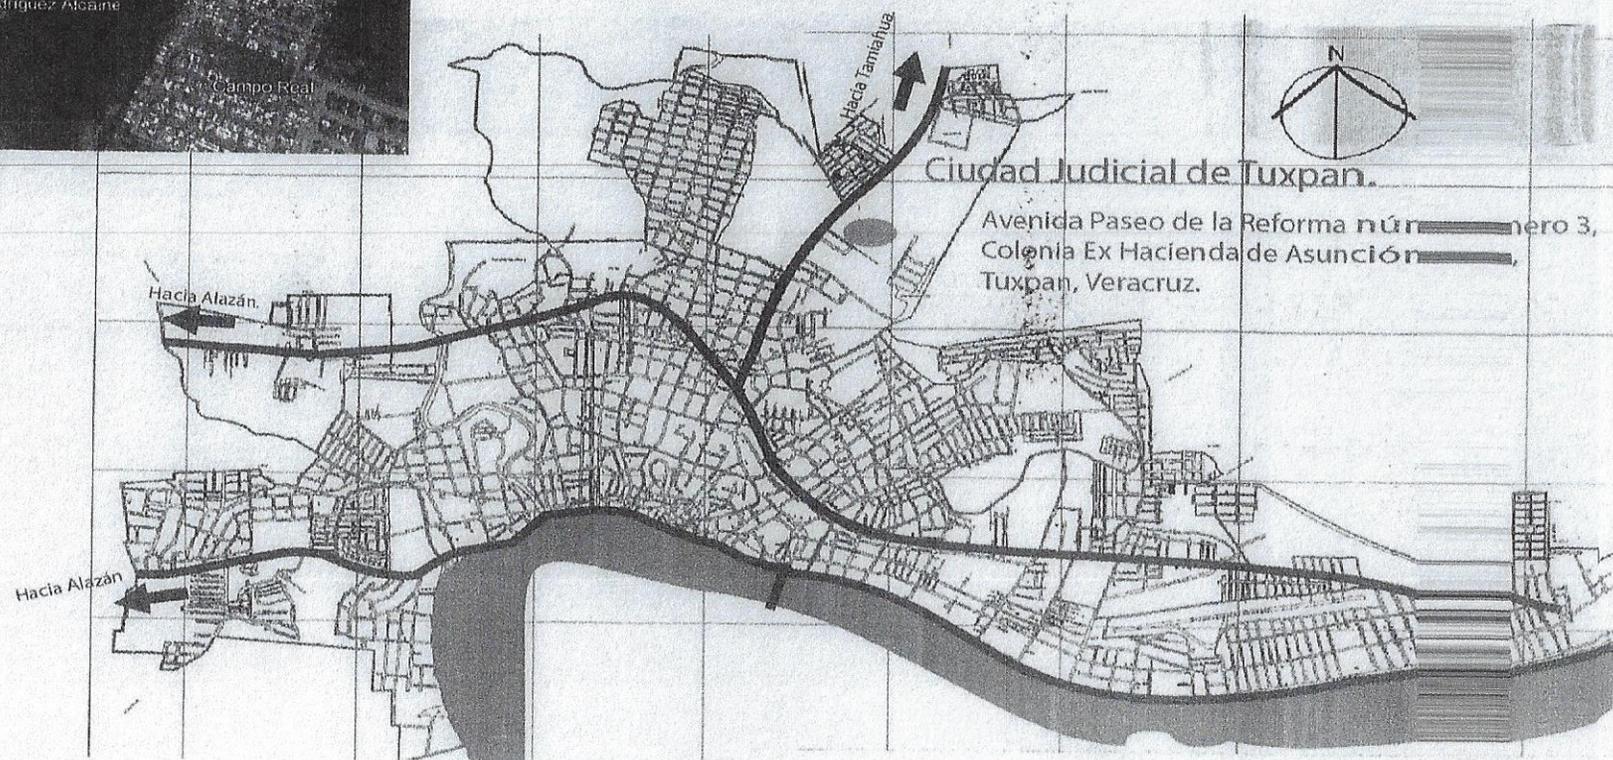



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES

REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	73,478,840.77
NÚMERO DE MES	MES	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
		%		%	
1	ENERO 2020	18.58%		4.08%	
2	FEBRERO 2020	12.37%		12.37%	
3	MARZO 2020	5.29%		5.29%	
4	ABRIL 2020	5.52%		5.52%	
5	MAYO 2020	4.78%		4.78%	
6	JUNIO 2020	2.00%		2.00%	
	TOTAL	48.54%		34.04%	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.


PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES

REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	73,478,840.77
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
AVANCE FÍSICO	18.58%	30.95%	36.24%	41.76%	46.54%	48.54%
AVANCE FINANCIERO	4.08%	16.45%	21.74%	27.26%	32.04%	34.04%

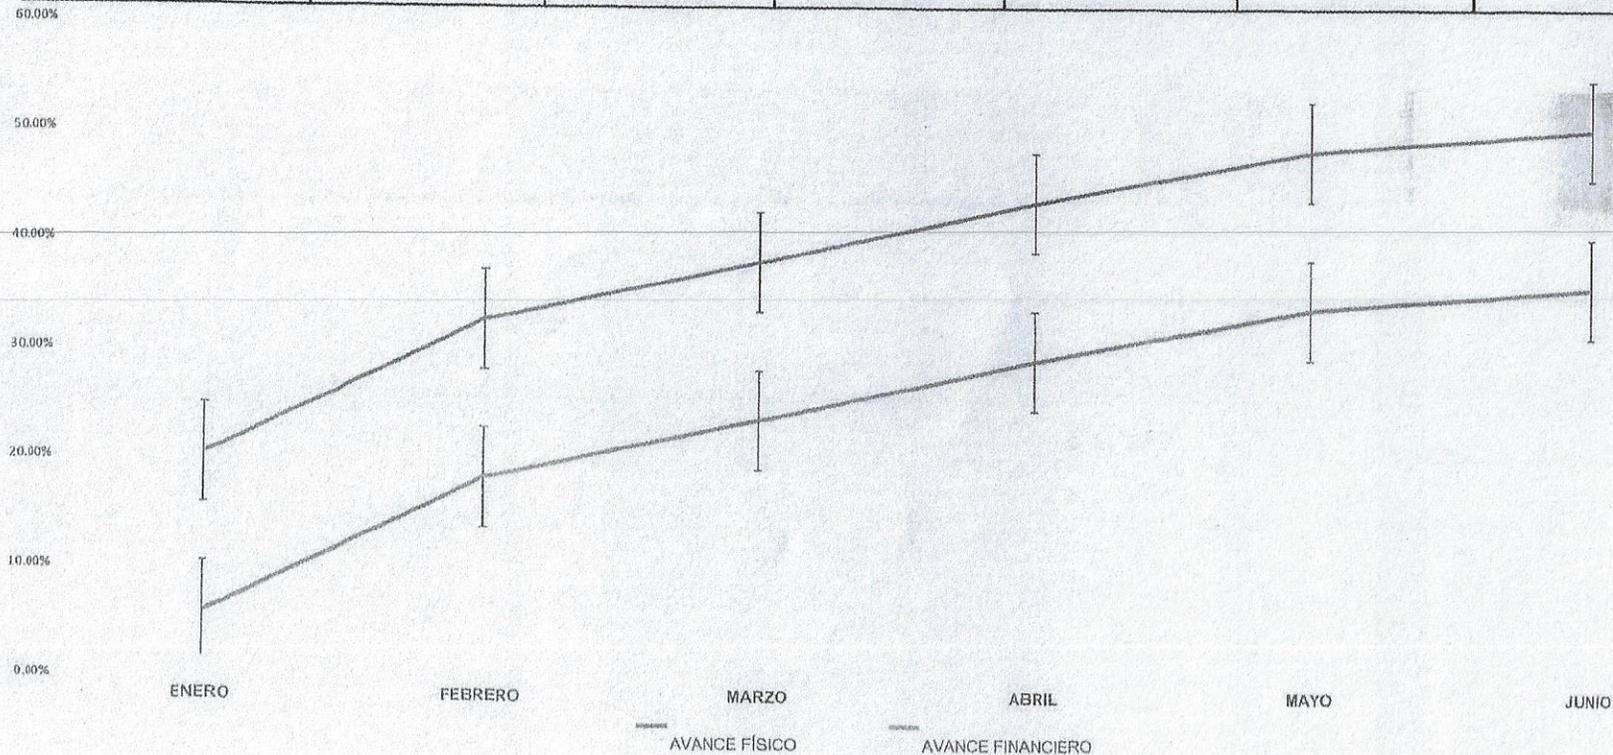



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

CI. NO. DGA/152/2019


PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	73,478,840.77
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------



PRELIMINARES, TERRAPLEN PARA DESPLANTE DEL EDIFICIO Y ESTACIONAMIENTO.

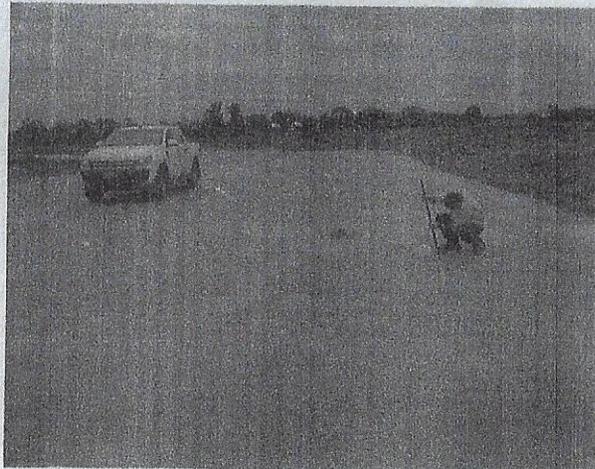

COMPACTACIÓN DE CAPA DE MEJORAMIENTO Y EXCAVACIONES PARA CIMENTACIÓN ÁREA DEL EDIFICIO Y ESTACIONAMIENTO.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.




PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES



REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	73,478,840.77
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

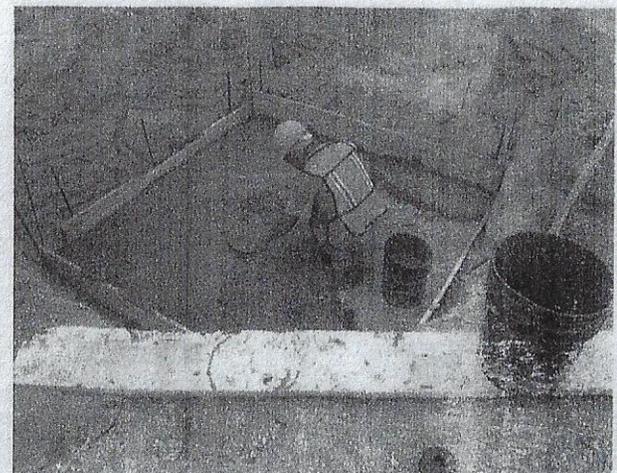

EXCAVACIONES PARA CIMENTACIÓN.

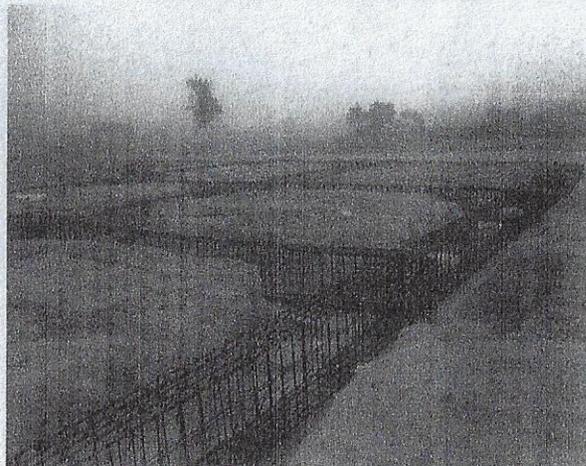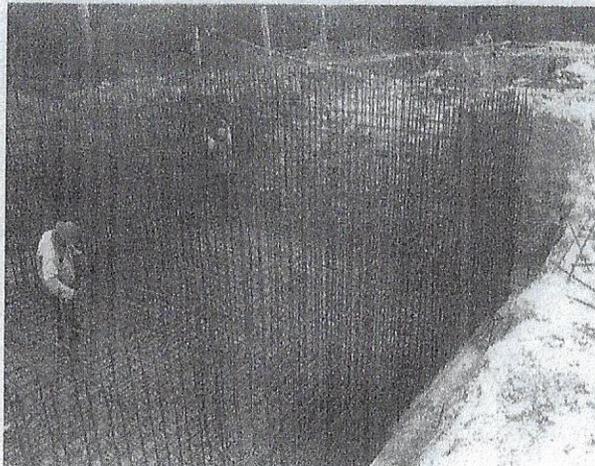

ARMADO CIMBRADO, COLADO DE CONTRATRABES, DADOS EN CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO Y CUARTO DE MAQUINAS



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ




OT. NO. DGA/1732/2019

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.



PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	73,478,840.77
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

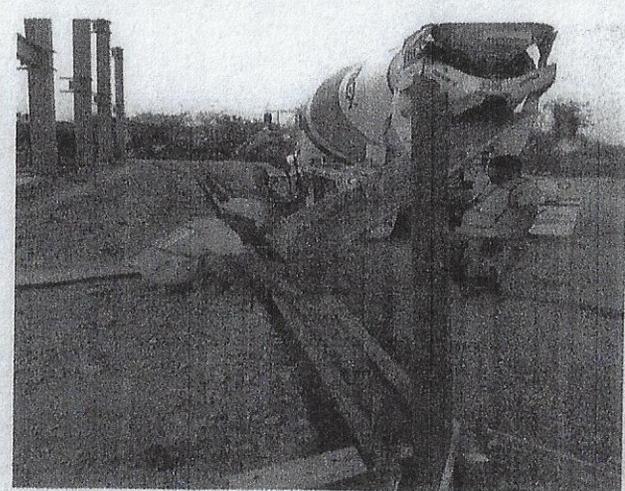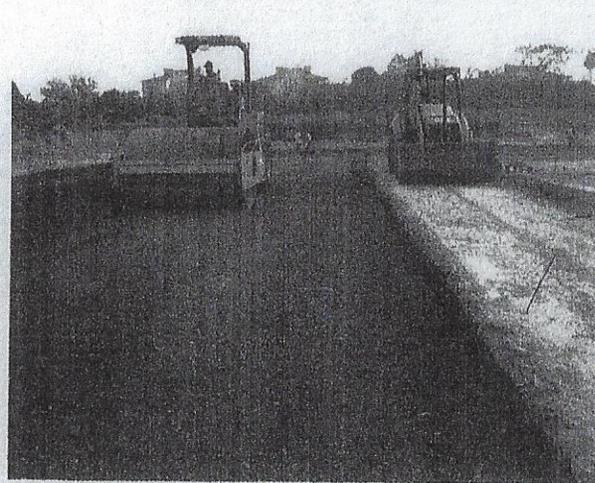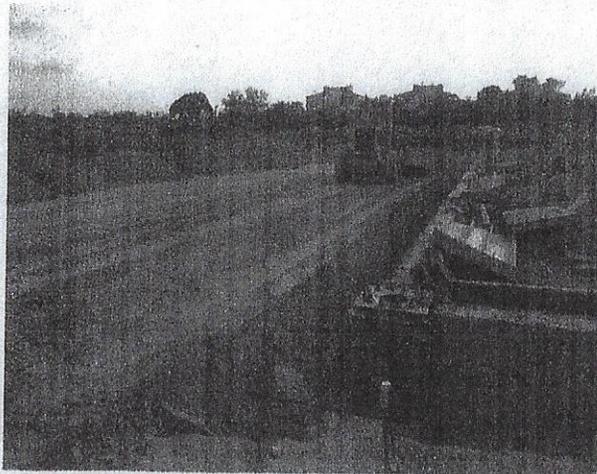

SUBRASANTE Y BASE EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO Y COLADO DE GUARNICIONES EN ESTACIONAMIENTO.

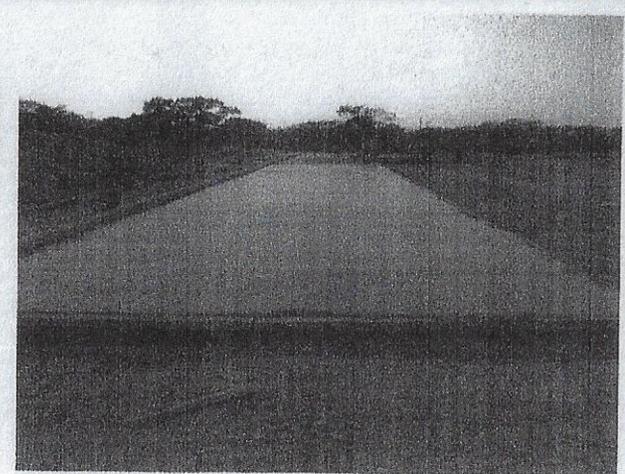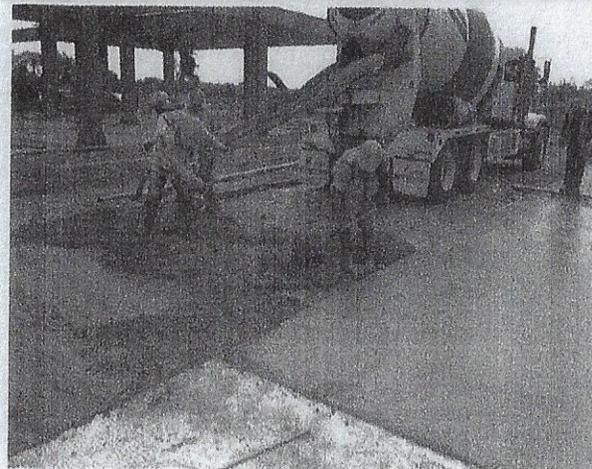

BANQUETAS, AFINE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HDRÁULICO EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES




REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA


INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	73,478,840.77
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

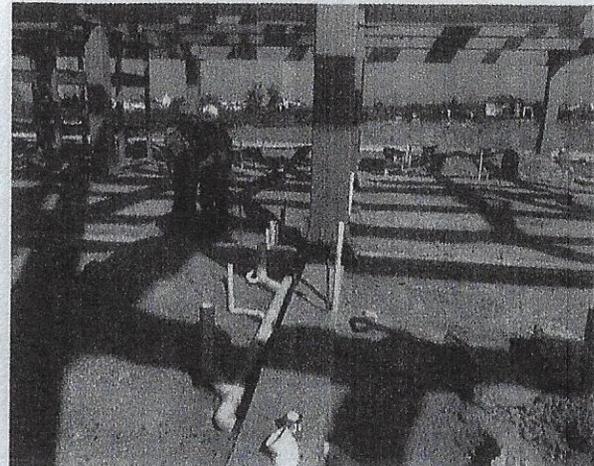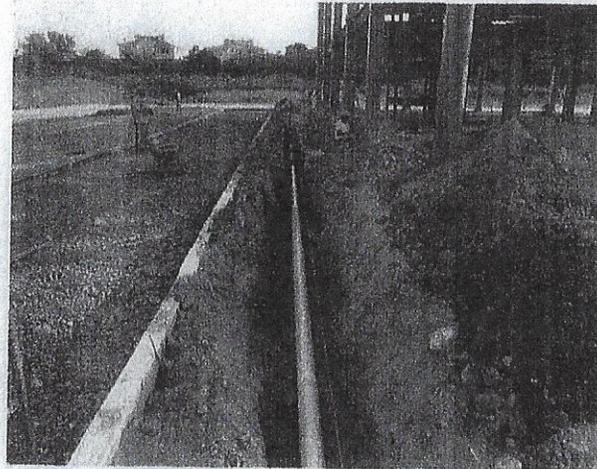

TRABAJOS DE INSTALACIONES PLUVIALES, SANITARIAS Y ELECTRICA

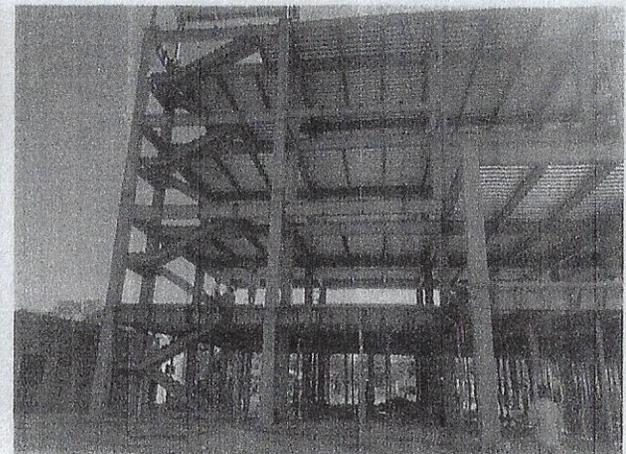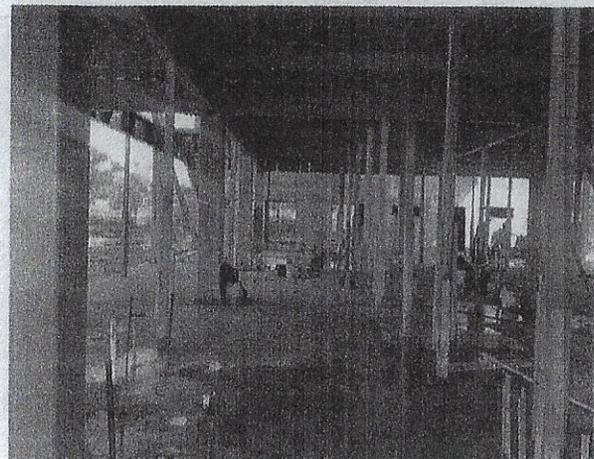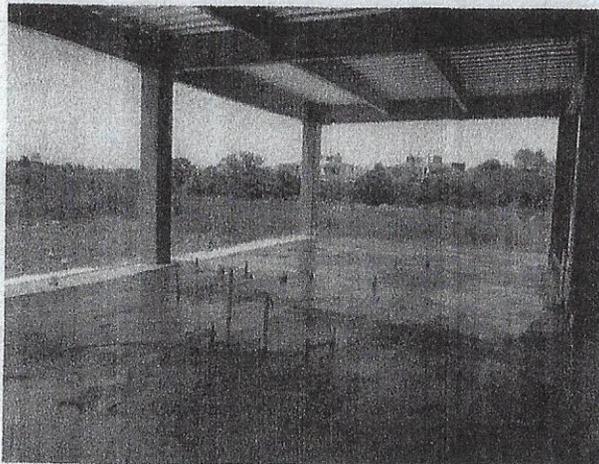

COLADO DE FIRME, CIMBRADO Y COLOCACIÓN DE LOSACERO.




PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES

REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	39,927,477.83
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

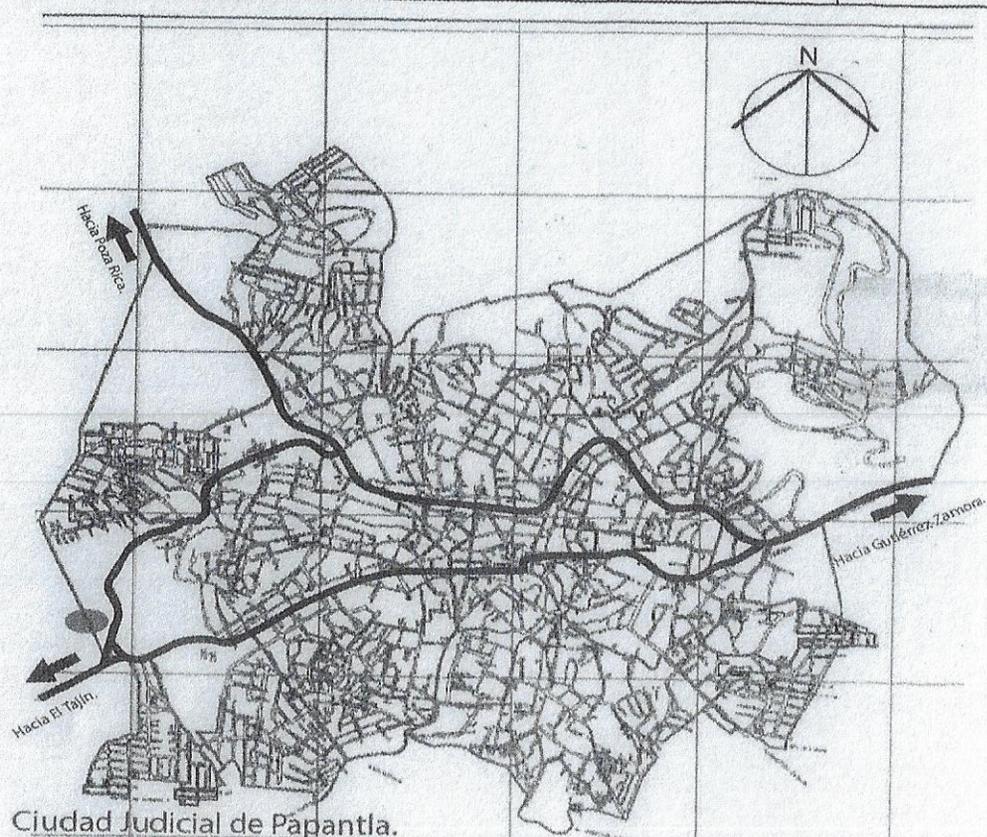

Ciudad Judicial de Papantla.
Calle Prolongación de 16 de Septiembre
número 709, Papantla, Veracruz.




PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES

REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	39,927,477.83
NÚMERO DE MES	MES	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
		%		%	
1	ENERO 2020	37.80%		5.69%	
2	FEBRERO 2020	9.15%		9.15%	
3	MARZO 2020	5.15%		5.15%	
4	ABRIL 2020	10.45%		10.45%	
5	MAYO 2020	2.42%		2.42%	
6	JUNIO 2020	2.89%		2.89%	
TOTAL		67.86%		35.75%	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.


PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES

REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	39,927,477.83
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------


	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
AVANCE FÍSICO	37.80%	46.95%	52.10%	62.55%	64.97%	67.86%
AVANCE FINANCIERO	5.69%	14.84%	19.99%	30.44%	32.86%	35.75%

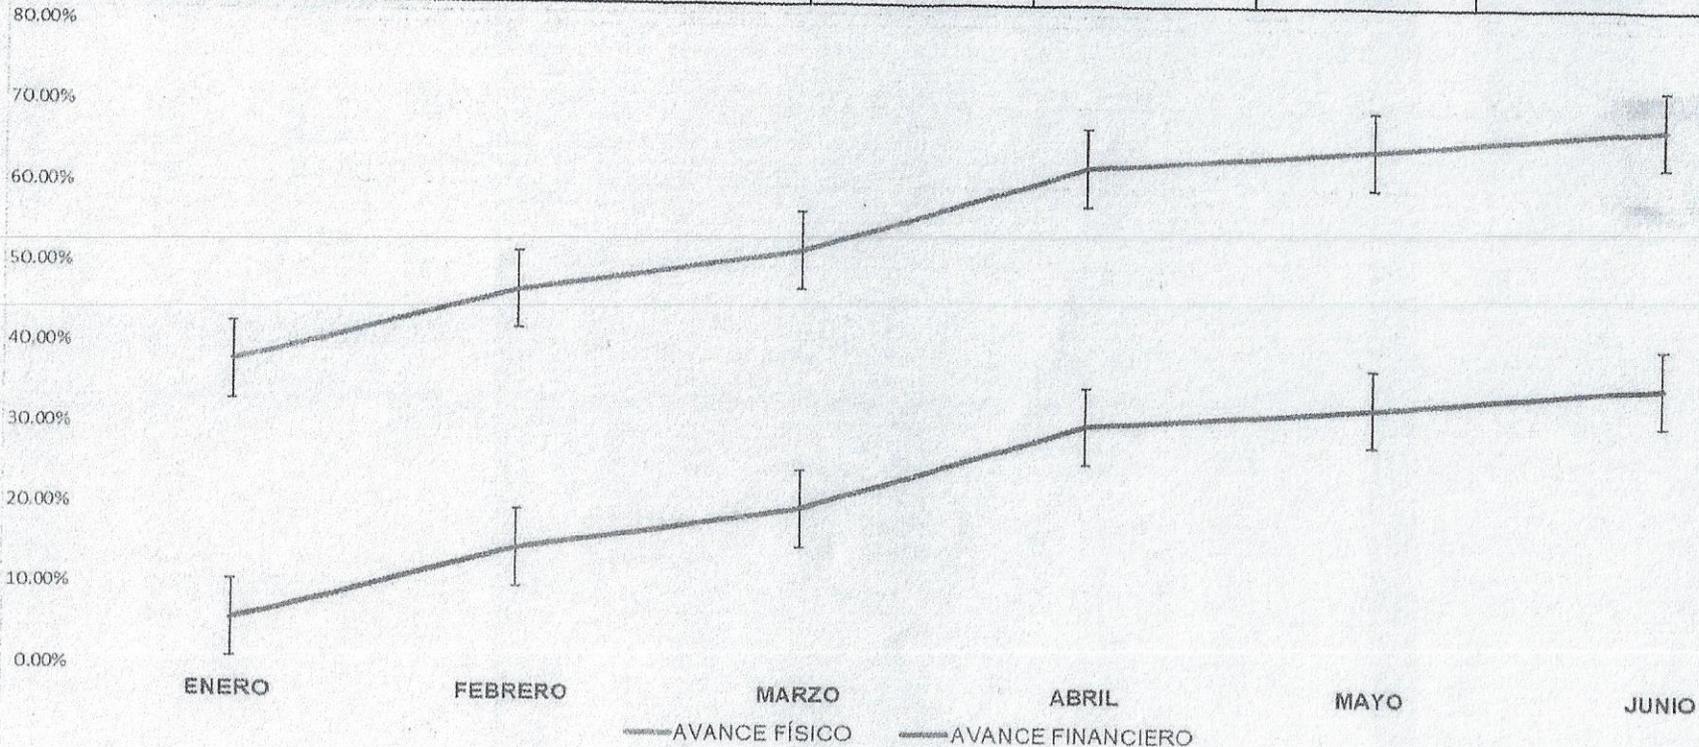



PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES
REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE
A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES
EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	39,927,477.83
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

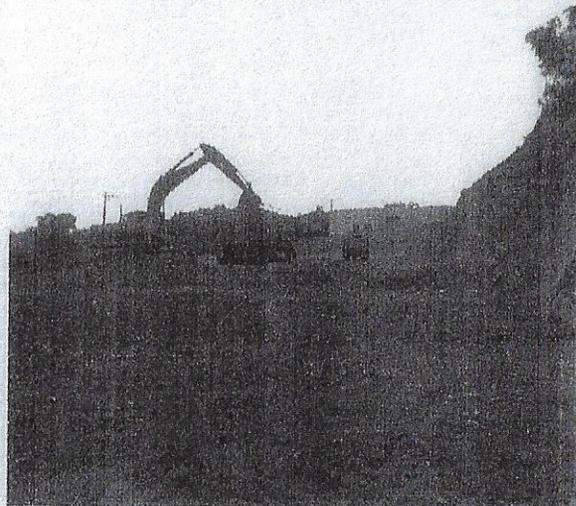


CORTE Y ACARREOS DE MATERIAL.

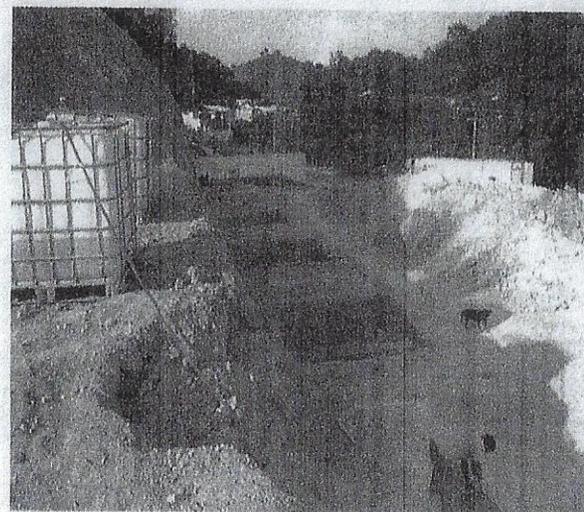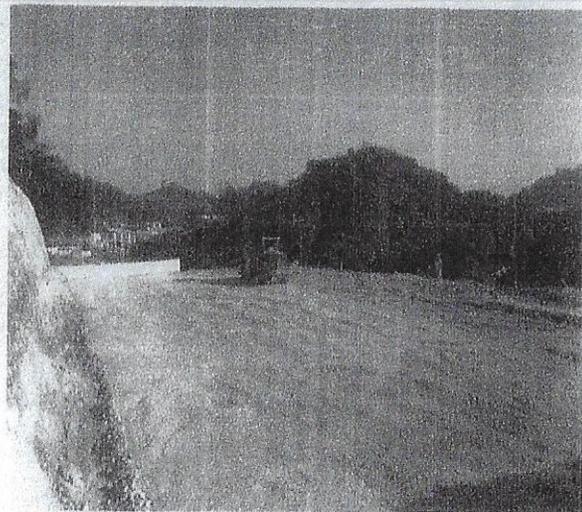

AFINE Y COMPACTACIÓN PARA NIVEL DE DESPLANTE DEL EDIFICIO.

EXCAVACIONES Y PLANTILLA PARA CIMENTACIÓN.



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Of. No. DGA/732/2019




PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	39,927,477.83
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------



TRABAJOS DE TERRACERIAS EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO.

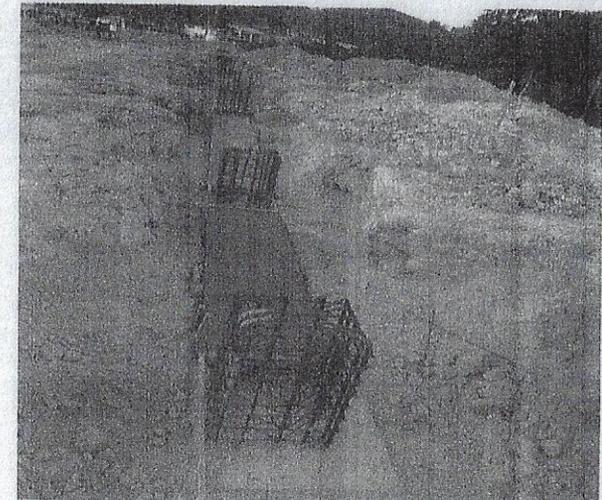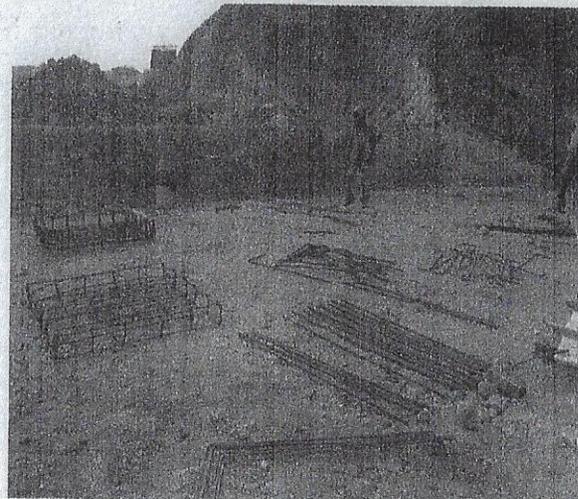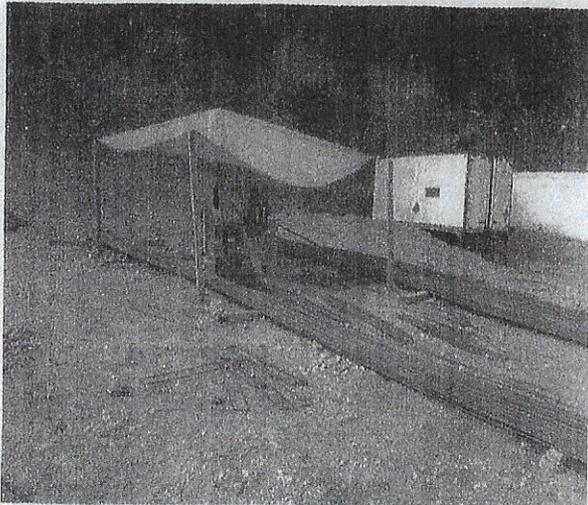

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACIÓN.

COLADO DE ZAPATAS AISLADAS PARA CIMENTACIÓN DELEDIFICIO.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.




PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES
REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE
A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES
EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	39,927,477.83
----------	----------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	---------------

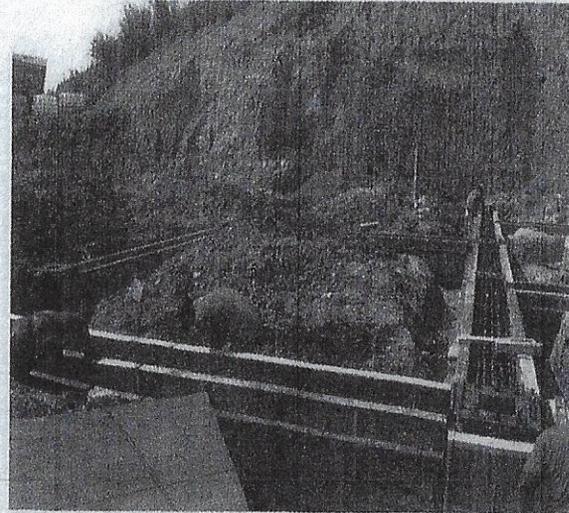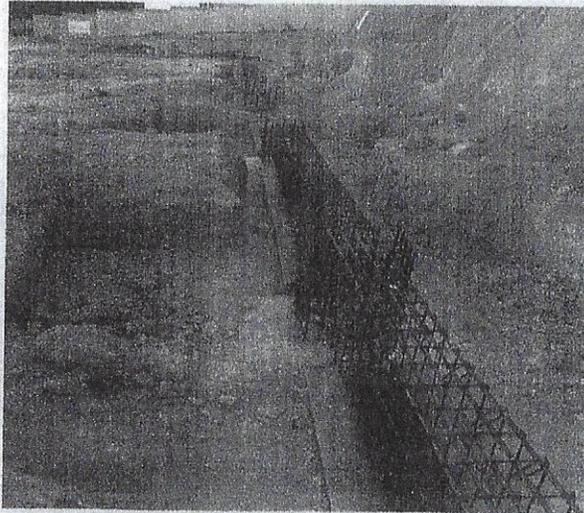

ARMADO, CIMBRADO Y COLADO EN CONTRATRABES Y DADOS EN CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO.

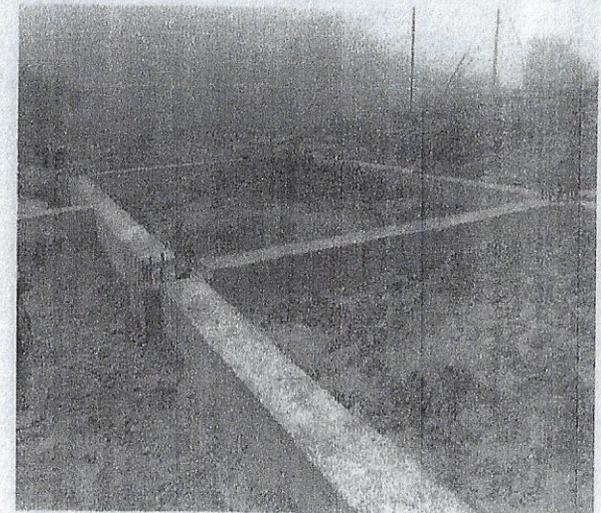




TRABAJOS DE COLADOS EN CONTRATRABES Y DADOS EN CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.




PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES JUDICIALES

REPORTE DEL AVANCE QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CIUDADES JUDICIALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

INFORME:	PRIMER SEMESTRE 2020	PERIODO:	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ENERO A JUNIO DE 2020	MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$	39,927,477.83
----------	----------------------	----------	---	-------------------------------	---------------

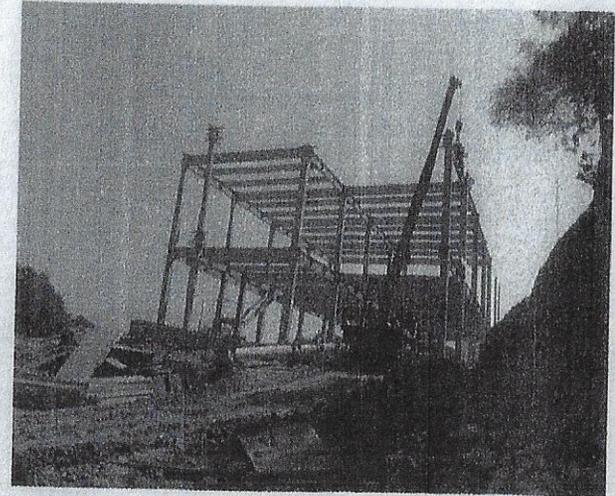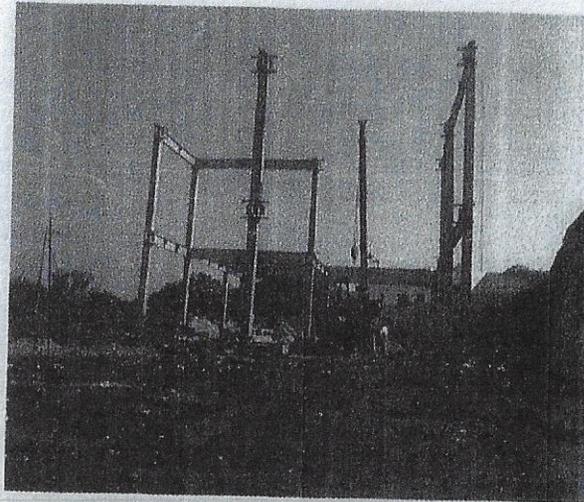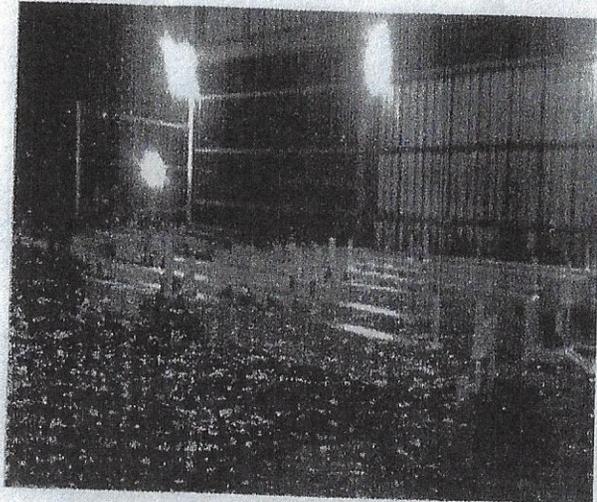

VISTA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS PARA LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO.

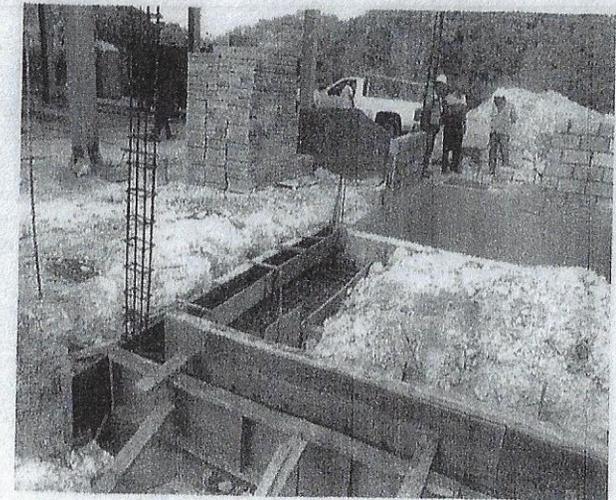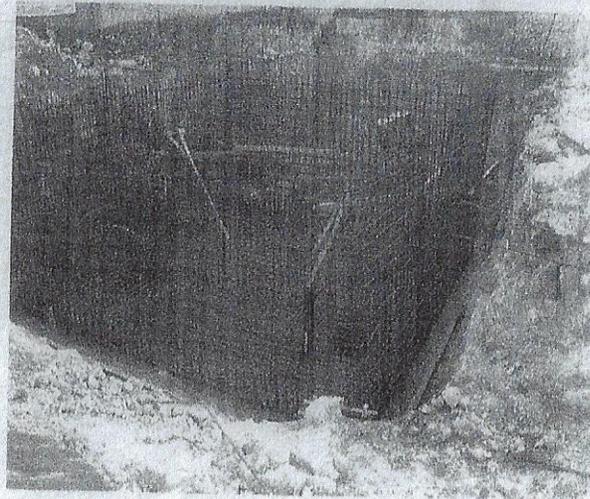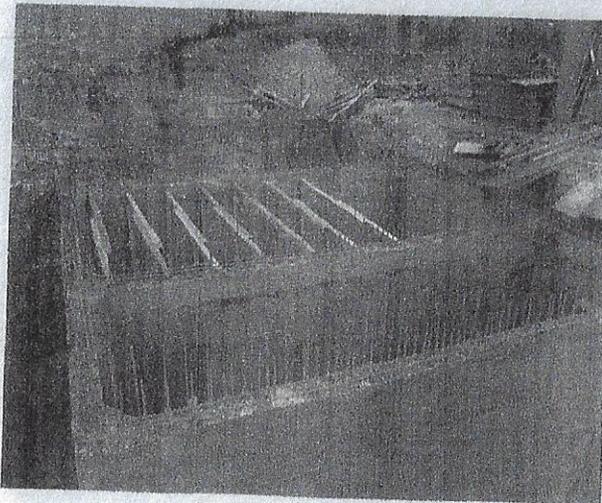

VISTA DE CIMENTACIÓN PARA EL CUARTO DE MÁQUINAS.

EXCAVACIONES EN ÁREA DE ACCESO PEATONAL.
